



TARSUS
ÜNİVERSİTESİ

YATIRIM PROGRAMI İzleme ve Değerlendirme Raporu

TARSUS - MART 2025

20
24





- Mustafa Kemal ATATÜRK Tarsus Şelalesinde

Eğitimidir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.

M. Atatürk





İÇİNDEKİLER.....	i
ÇİZELGELER TABLOSU.....	ii
1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
2. GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1. MİSYONUMUZ	5
2.2. VİZYONUMUZ.....	5
2.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ.....	5
2.4. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
2.5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	8
2.6. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	9
2.7. 2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	12
2.7.1. <i>Hedeflenen</i>	12
2.7.2. <i>Gerçekleşen</i>	12
2.7.3. <i>Devam Eden</i>	12
2.8. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	13
2.8.1. <i>Genel Yatırım Uygulama Durumu</i>	13
2.8.2. <i>Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri</i>	19
2.8.3. <i>Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar</i>	22
3. PROJE UYGULAMALARI	23
3.1. 2024H03-233485 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	23
3.2. 2024H03-233483NOLU MUHTELİF İŞLER	23
3.3. 2024H03-233486 NOLU YAYIN ALIMI PROJESİ	28
3.4. 2019H03-104827 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	29
3.4.1. <i>Çevre İstinat Duvarı Yapım İşİ</i>	32
3.4.2. <i>Giriş Kapısı ve Genel Çevre Düzenleme Yapılması Yapım İşİ</i>	33
3.5. 2019H03-134615 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	34
3.5.1. <i>Kütüphane Binası Yapım İşİ</i>	36
3.6. 2023H05-191421 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ	36
3.6.1. <i>MYO Kampüsü Spor Tesisleri Yapım İşİ</i>	37
4. STRATEJİK PLAN – YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ	39
5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR.....	40
6. ÖNERİLER.....	41



ÇİZELGELER TABLOSU

Çizelge 1: Stratejik Amaçlar	6
Çizelge 2: Stratejik Amaç -1 ve Hedefleri	6
Çizelge 3: Stratejik Amaç -2 ve Hedefleri	6
Çizelge 4: Stratejik Amaç - 3 ve Hedefleri	7
Çizelge 5: Stratejik Amaç - 4 ve Hedefleri	7
Çizelge 6: Stratejik Amaç - 5 ve Hedefleri	7
Çizelge 7: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları	8
Çizelge 8: Taşınmazların Dağılımı (m ²)	9
Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)	10
Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)	11
Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı	13
Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)	14
Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)	16
Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)	16
Çizelge 15: Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri (IV. Düzey)	17
Çizelge 16: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	17
Çizelge 17: Menkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	18
Çizelge 18: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	18
Çizelge 19: Revizyon (2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)	19
Çizelge 20: Revizyon (2024H03-233483Nolu Muhtelif İşler)	19
Çizelge 21: Revizyon (2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı)	20
Çizelge 22: Revizyon (2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı)	20
Çizelge 23: Revizyon (2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler)	21
Çizelge 24: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (YİTDB)	27
Çizelge 25: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (OSB MYO)	27
Çizelge 26: 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi	28
Çizelge 27: 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı	29
Çizelge 28: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	29
Çizelge 29: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı	30
Çizelge 30: Çevre İstinat Duvarı Yapım İşİ	32
Çizelge 31: Giriş Kapısı ve Genel Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	33
Çizelge 32: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	34
Çizelge 33: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları(Mühendislik Fakültesi Binası)	34
Çizelge 34: Mühendislik Fakültesi Binası Yapım İşİ	36
Çizelge 35: 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	36
Çizelge 36: 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamaları	37
Çizelge 37: Açık Spor Tesisleri Yapım İşİ	38



1. YÖNETİCİ ÖZETİ



Mersin ili Tarsus ilçesinin güzide yükseköğretim kurumu Tarsus Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Tarsus Üniversitesi olarak bir yandan geniş bir yelpazede önlisansdan doktora kadar nitelikli eğitim-öğretim programları ile bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlarken diğer yandan yapacağımız özgün araştırmalarla bilime,

insanlığa ve bölgemizin/ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sağlamak ana hedefimizdir.

Bütün paydaşlarımızla yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversite misyonunu ve farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Üniversite-Sanayi/Üniversite-Şehir bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

2024 yılında da Üniversitemiz gelişim planına göre ilk etap projelerini uygulamaya koyma gayretimizi sürdürdük. 2024 yılı yatırım programında yer alan *Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binasının* inşaa süreci tamamlanarak faaliyete alınmıştır. Yine kuzey (merkez) yerleşkemizde yer alan *Kütüphane Binasının* inşaa sürecine devam edilmektedir. Aynı zamanda mevcut binalarımıza ilişkin revize, bakım ve onarım faaliyetlerine de devam edilmiştir.

2024 yılı bütçemizde yer alan yatırıma yönelik ödeneklere bakıldığında, eğitim - öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına ilişkin politikaların öncelendiği görülmektedir. Buna yönelik olarak gerekli makine-teçhizat, fiziki ve teknolojik altyapı, yazılım alımları alanlarında ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve elektronik yayın alımlarında bu bütçenin kullanımına özen gösterdik.

Üniversitemizin kuruluşundan sonra açılan akademik birimlerimiz ile birlikte 2024 yılı sonu itibarıyla toplamda yedi fakülte, bir yüksekokul, üç meslek yüksekokulu, bir enstitü ve altı uygulama ve araştırma merkezi sayısına eriştik.

Bütçe imkanları ve tasarruf anlayışı gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi prensibi ile 2024 yılında çalışmalarını sürdürdüğümüz yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı *“2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu”* nu kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygılarımla sunar, çalışmalarda ve raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ali ÖZEN
Rektör





2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Misyonumuz

Tarsus Üniversitesi, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan saygın bir iş birliği içinde toplum yararına hizmet üreten yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir.

2.2. Vizyonumuz

Tarsus Üniversitesinin vizyonu, daima mükemmelin izinde, mensubu olmaktan onur duyulan, saygın bir dünya üniversitesi olmaktır.

2.3. Temel Değerlerimiz

- ✓ Adalet
- ✓ Liyakat
- ✓ İstişare
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Etik değerlere bağlılık
- ✓ Mükemmeliyetçilik
- ✓ Sürekli iyileşmeye açıklık
- ✓ Yenilikçilik ve özgünlük
- ✓ Yerele odaklılık ve küresel rekabetçilik
- ✓ Kurumsal aidiyet



2.4. Temel Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR
Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek.
Amaç 2: Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak.
Amaç 3: Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü geliştirerek üretilen bilgi ve teknolojinin üretime dönüşmesini sağlamak.
Amaç 4: Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek.
Amaç 5: Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliğini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak.

Çizelge 1: Stratejik Amaçlar

AMAÇ 1	HEDEFLER
Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek.	Program müfredatlarını, yenilik ve gelişmeler doğrultusunda çağın gerekliliklerini, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellemek
	Ders süreçlerini, karşılıklı etkileşimi ve aktif öğrenci katılımını artıracak şekilde düzenlemek.
	Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programı kapsamında gelen/giden öğrenci ve öğretim elemanı sayısını %20 artırmak.
	Ülkenin kalkınma planında yer verilen öncelikli alanlar başta olmak üzere lisansüstü program sayısını artırmak.
	Nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen lisans program sayısını artırmak.

Çizelge 2: Stratejik Amaç -1 ve Hedefleri

AMAÇ 2	HEDEFLER
Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak.	Plan dönemi sonuna kadar öğretim üyesi başına düşen nitelikli yayın sayısını %3 artırmak.
	Bilimsel araştırmalarda dış kaynak desteklerinin sayısını ve çeşitliliğini artırmak.
	Plan dönemi sonuna kadar lisansüstü tezlerden üretilen nitelikli yayın sayısını %20 artırmak.
	Öğretim elemanlarının araştırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere katılımlarını artırmak.
	Üniversite kaynaklı patent başvuru/tescil sayısını artırmak.

Çizelge 3: Stratejik Amaç -2 ve Hedefleri



AMAÇ 3	HEDEFLER
Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü geliştirerek üretilen bilgi ve teknolojinin üretime dönüşmesini sağlamak.	Üniversite-özel sektör işbirliğiyle, girişimcilik ve yenilikçilik kapsamında gerçekleştirilen faaliyet sayısını artırmak.
	Girişimcilik ve yenilikçilik alanında farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak.

Çizelge 4: Stratejik Amaç - 3 ve Hedefleri

AMAÇ 4	HEDEFLER
Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	Kampüsteki eğitim-öğretim, araştırma ve idari kullanım alanlarını artırmak.
	Üniversite personelinin niteliğini ve niceliğini artırmak.
	Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphane kaynaklarını artırmak.
	Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek ve olanaklarını artırmak.
	Kurumsallaşmayı geliştirmek ve kurumsal iletişimin etkinliğini artırmak.

Çizelge 5: Stratejik Amaç - 4 ve Hedefleri

AMAÇ 5	HEDEFLER
Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliğini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak.	Öğrenci topluluklarının ve faaliyetlerinin sayısını artırmak.
	Kültür, sanat, spor ve topluma yönelik hizmet faaliyetlerini artırmak.
	Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik olanakları artırmak.
	Mezunlarla iletişim ve işbirliğini artırmak.

Çizelge 6: Stratejik Amaç - 5 ve Hedefleri



2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna bağlı (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan özel bütçeli bir idaredir.

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 180.200.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ve tenkis edilen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 197.279.000,00 TL olmuştur. Projelerin sektöre göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2024 Yılı Program Ödeneği	2024 Yılı Revizeli Ödenek	2024 Yılı Harcama
Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	40.600.000,00	8.610.000,00	19.800.000,00	20.000.000,00	16.485.511,31
Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	120.000.000,00	0,00	92.000.000,00	104.120.000,00	96.766.401,88
Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.460.722,14
Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler	67.059.000,00	0,00	60.200.000,00	67.059.000,00	55.415.115,22
Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	12.000.000,00	3.349.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	3.661.525,37
Kamulaştırma	P0_857 Kamulaştırma	0	0	13.376.000,00	13.376.000,00	13.375.795,59
TOPLAM		241.459.000,00	11.959.000,00	193.576.000,00	210.855.000,00	187.465.071,61

Çizelge 7: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları




2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların % 85'ü Kuzey Yerleşkesinde, yaklaşık %15'si diğer yerleşkelerde yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Taşınmaz Maliki	Alan
Kuzey Yerleşkesi	Maliye Hazinesi	137.907,00
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi*	Tarsus Üniversitesi	23.086,00
OSB Yerleşkesi	Mersin Tarsus OSB Müdürlüğü	2.000,00
Genel Toplam		162.993,00

Çizelge 8: Taşınmazların Dağılımı (m²)

* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinin hizmete alma süreci devam etmektedir.

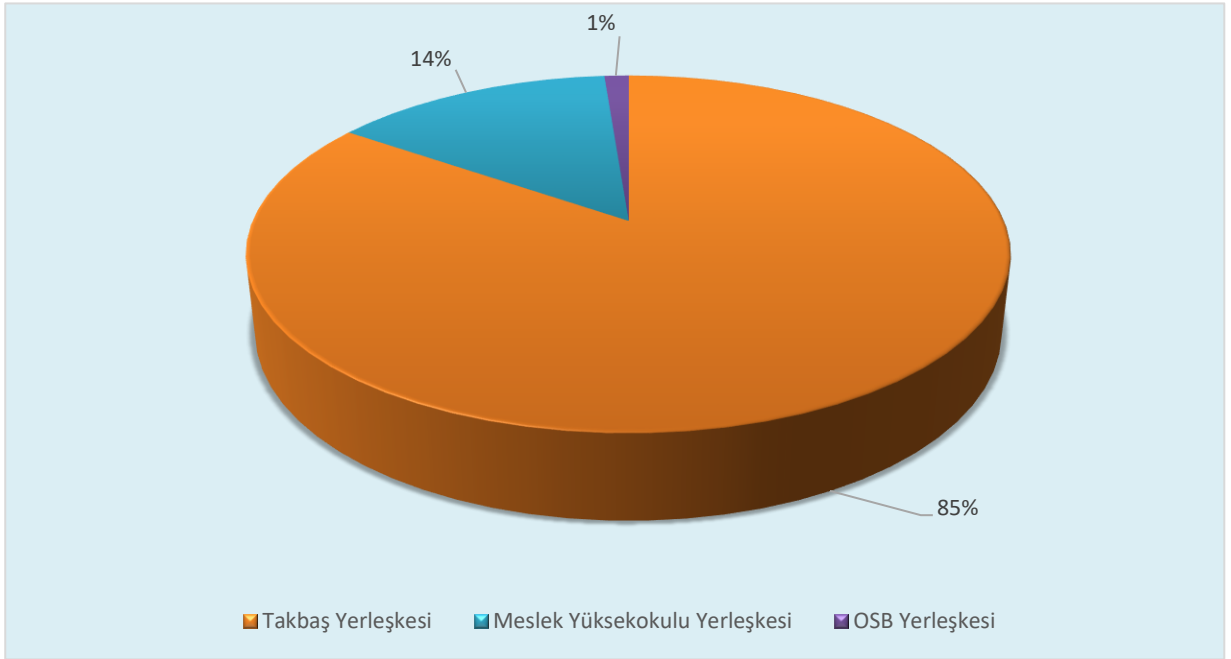

Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke itibarıyla Dağılımı




Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Hizmet Alanı	Kuzey Yerleşkesi	Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	OSB Yerleşkesi	Toplam
İdari	5.828,00	-	528,00	6.356,00
Eğitim	7.107,00	-	1.020,00	8.127,00
Sosyal	1503	-	-	1.503,00
Spor	-	-	-	0,00
Diğer	12.356,00	6.859,00*	387,00	19.602,00
Genel Toplam	26.794,00	6.859,00	1.935,00	35.588,00

Çizelge 9: Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi hizmete alım süreci devam ettiği için alanların dağılımı yapılmamıştır.

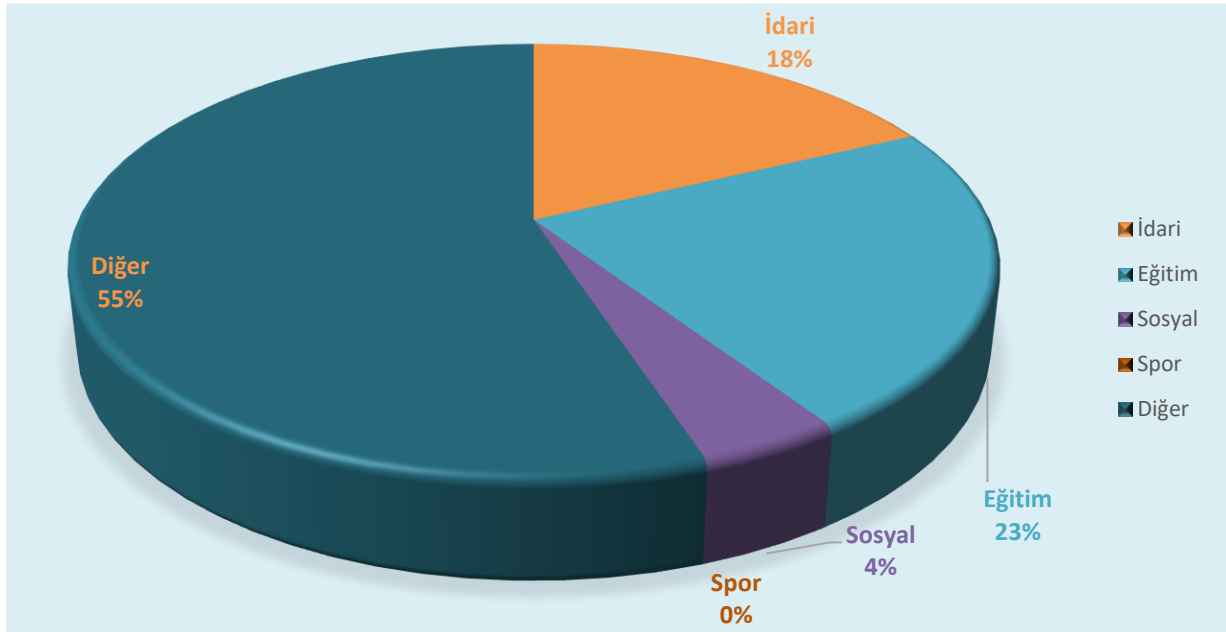

Grafik 2: Taşınmazların hizmet alanları itibarıyla dağılımı



Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Diğer
A Blok	832,00	1.299,00	0,00	278,00	2.129,00
B Blok	1.735,00	1.593,00	0,00	213,00	3.259,00
B Blok	1.069,00	1.338,00	0,00	0,00	1.444,00
Mühendislik Fakültesi (A)	486,00	1.665,00	0,00	0,00	1.490,00
Mühendislik Fakültesi (B)	945,00	718,00	0,00	0,00	1.583,00
Mühendislik Fakültesi (C)	0,00	0,00	0,00	243,00	206,00
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	540,00	494,0	0,00	0,00	1.412,00
Tarsus Üniversitesi Göl Kafe Binası	0,00	0,00	0,00	33,00	20,00
Yemekhane Binası	0,00	0,00	0,00	704,00	601,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası	159,00	0,00	0,00	32,00	101,00
Organize Sanayi Bölgesi MYO Yerleşkesi	528,00	1.020,00	0,00	0,00	387,00
Merkezi İmalat Atölye Binası	62,00	0,00	0,00	0,00	111,00
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.859,00				
TOPLAM	6.356,00	8.127,00	0,00	1.503,00	12.743,00
GENEL TOPLAM	35.588,00 m²				

Çizelge 10: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi hizmete alma süreci devam ettiği için alanların dağılımı yapılmamıştır.



2.7. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.7.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım programında eğitim-yükseöğretim sektöründe beş, beden eğitimi ve spor sektöründe bir adet olmak üzere toplam altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt-projelerin hazırlanması hedeflenmiştir.

2024 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.7.2. Gerçekleşen

2024 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- ✓ Üniversitemiz çevre düzenleme ve giriş kapısı yapım işinin %100'ü tamamlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası yapım işinin %100'ü tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.
- ✓ Üniversitemiz çevre istinat duvarı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale edilmiş olup yapım işi tamamlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, klima, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük – küçük bakım onarımları yaptırılmıştır.
- ✓ 2024 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın niteliğinin stratejik planımızda hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar gerçekleştirilmiştir.

2.7.3. Devam Eden

- ✓ Kütüphane Binası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale edilmiş olup yapım işinin %90'ı tamamlanmıştır.




2.8. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 180.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde net ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı 211.175.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 187.465.071,61 TL'si harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %88,77 olmuştur. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir. Sermaye Giderleri gerçekleştirmelerinin %15,00'i mamul mal alımları, %2,00'sini gayri maddi hak alımları, %7,00 'ü gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderleri, %67,00'si gayrimenkul sermaye üretim giderleri, %0,52'si menkul malların büyük onarım giderleri, %8,48 'ini gayrimenkul büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.

Ekonomik Kod	Başlangıç Ödeneği	Net Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcamanın Toplam Ödeneğe Oranı
06.1	33.000.000,00	3.986.000,00	36.986.000,00	27.944.024,14	75,55%
06.3	5.200.000,00	-752.000,00	4.448.000,00	3.742.404,06	84,14%
06.4	0,00	13.376.000,00	13.376.000,00	13.375.795,59	100,00%
06.5	117.000.000,00	21.120.000,00	138.120.000,00	126.572.267,00	91,64%
06.6	1.000.000,00	13.000,00	1.013.000,00	983.543,48	97,09%
06.7	24.000.000,00	-6.786.000,00	17.232.000,00	14.847.037,34	86,16%
Toplam	180.200.000,00	30.975.000,00	211.175.000,00	187.465.071,61	88,77

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı

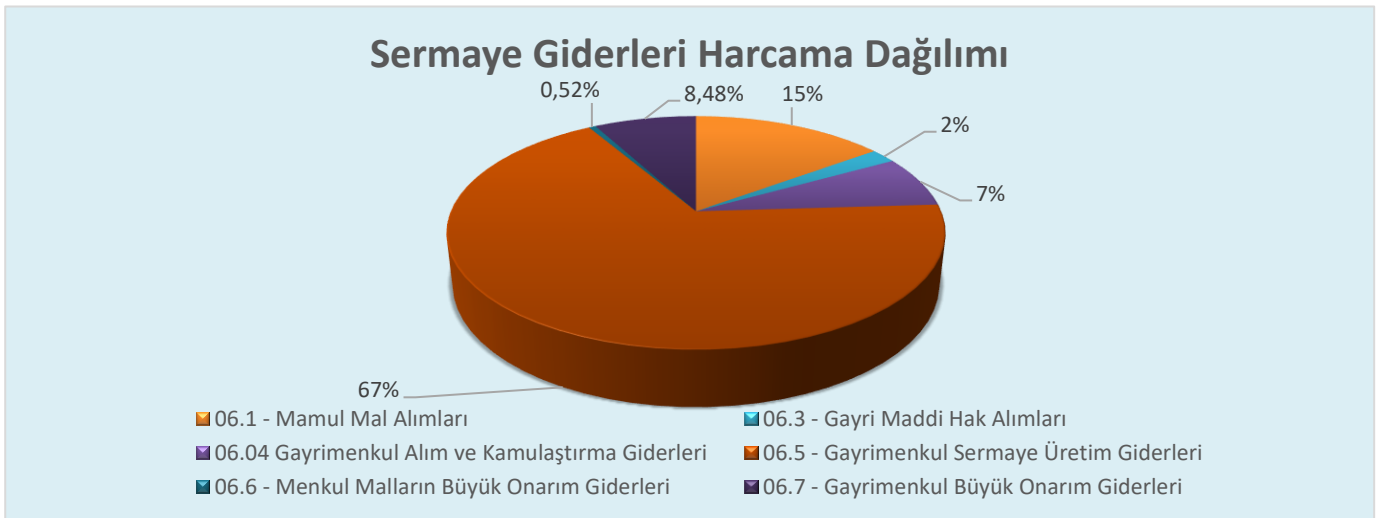

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı



Sermaye giderlerine ilişkin 2024 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
06	01	10	01	Büro Mefruşatı Alımları	7.081.577,31
06	01	10	03	Okul Mefruşatı Alımları	302.770,81
06	01	10	90	Diğer Mefruşat Alımları	1.612.889,22
06	01	10		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	8.997.237,34
06	01	20	01	Büro Makinaları Alımları	475.406,98
06	01	20	03	Tıbbi Cihaz Alımları	3.692,77
06	01	20	04	Laboratuvar Cihazı Alımları	2.050.746,37
06	01	20	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	364.992,72
06	01	20	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	3.097.782,32
06	01	20		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	5.992.621,16
06	01	30	02	Atölye Gereçleri Alımları	417.066,60
06	01	30		Avadanlık Alımları	417.066,60
06	01	60	01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	735.006,00
06	01	60	03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	725.716,14
06	01	60		Yayın Alımları ve Yapımları	1.460.722,14
06	01	80	04	Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	2.646.250,41
06	01	80	03	Bilgisayar Alımları	5.820.686,70
06	01	80	02	Güvenlik Donanımı Cihazları Alımları	2.056.125,43
06	01	80	01	Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	553.314,36
06	01	80		Bilişim Donanım Alımları	11.076.376,90
06	01			Mamul Mal Alımları	27.944.024,14
06	03	10	01	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	2.545.054,93
06	03	10		Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri	2.545.054,93
06	03	20	02	Plan Proje Alımları	300.000,00
06	03	20		Harita Plan Proje Alımları	300.000,00
06	03	30	90	Diğer Lisans Alımları	31.838,33
06	03	30	01	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	865.510,80
06	03	30		Lisans Alımları	897.349,13
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	3.742.404,06
06	04	20	90	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	13.375.795,59
06	04	20		Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	13.375.795,59
06	04			GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	13.375.795,59
06	05	70	90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	12.219.396,19
06	05	70	01	Hizmet Binası Yapım Giderleri	114.352.870,81
06	05	70		Müteahhitlik Giderleri	126.572.267,00
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	126.572.267,00
06	06	20	01	Malzeme Giderleri	958.663,48
06	06	20		Malzeme Giderleri	958.663,48
06	06	90	01	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	24.880,00
06	06	90		Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	24.880,00
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	983.543,48
06	07	90	01	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.182.720,00
06	07	90		Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.182.720,00
06	07	20	90	Diğer Malzeme Giderleri	110.088,00
06	07	20	03	Sıhhi Tesisat Giderleri	30.900,00
06	07	20	01	Malzeme Giderleri	143.208,00
06	07	20		Malzeme Giderleri	143.208,00
06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	14.847.037,24
06				Sermaye Giderleri	187.465.071,51

Çizelge 12: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)



06.1 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 33.000.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 14.686.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 10.700.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 36.986.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233483 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 26.483.302,00 TL, 2024H03-233486 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 1.460.722,14 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 27.944.024,14 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı %75,55 olarak gerçekleşmiştir. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	7.008.137,31	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.10.01	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	73.440,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.10.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	302.770,81	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	512.213,22	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.10.90	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	1.100.676,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.10	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları				8.997.237,34
06.1.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	475.406,98	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.20.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımları	3.692,77	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımları	2.050.746,3	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.20.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	364.992,72	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.20.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	516.577,52	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.20.90	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.029.468,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.20.90	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.551.736,80	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları				5.992.621,16
06.1.30.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Atölye Gereçleri Alımları	44.880,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.30.02	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Atölye Gereçleri Alımları	372.186,60	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.30	Avadanlık Alımları				417.066,60
06.1.60.01	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	735.006,00	2024H03-233486	Yayın Alımı
06.1.60.03	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	725.716,14	2024H03-233486	Yayın Alımı



Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.60	Yayın Alımları ve Yapımları				1.460.722,14
06.1.80.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	2.646.250,41	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.80.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	5.770.526,94	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.80.03	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Bilgisayar Alımları	50.159,76	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.80.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Güvenlik Donanımı Cihazları Alımları	2.056.125,43	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.80.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	553.314,36	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.1.80	Bilişim Donanım Alımları				11.076.376,90
06.1	Mamul Mal Alımları				27.944.024,14

Çizelge 13: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 5.200.000,00 TL olan 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde 348.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 1.100.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 4.448.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233483 nolu Muhtelif İşler Projeleri kapsamında 3.742.404,06 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı %84,14 olarak gerçekleşmiştir. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına Çizelge-14'de yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.3.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	2.297.074,93	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.3.10.01	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	247.980,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.3.10	Bilgisayar Yazılım Alımları				2.545.054,93
06.3.20.02	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı	Plan Proje Alımları	300.000,00	2024H03-233483	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
06.3.20	Harita Plan Proje Alımları				300.000,00
06.3.30.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Lisans Alımları	31.838,33	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.3.30.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	865.510,80	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.3.30	Lisans Alımları				897.349,13
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları				3.742.404,06

Çizelge 14: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)



06.04 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması

Başlangıç ödeneği öngörülmemiş olan 06.04 Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri için yıl içinde 13.375.795,59 TL ödenek ekleme işlemi yapılmış ve toplam ödenek 13.375.795,59 TL olmuştur. PO_857 Özel Mülkiyete konu taşınmazın kamulaştırılmasında 13.375.795,59 TL harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı %100,00 olarak gerçekleşmiştir. 06.04 Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri ilişkin harcama detayına Çizelge-15'te yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.4.20.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	13.375.795,59	PO_857	Yerleşke bütünlüğünün sağlanması açısından iki hazine parseli arasında kalan özel mülkiyete konu taşınmazın kamulaştırılması
06.4.20	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	13.375.795,59	PO_857-	Yerleşke bütünlüğünün sağlanması açısından iki hazine parseli arasında kalan özel mülkiyete konu taşınmazın kamulaştırılması
06.4	Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri				13.375.795,59

Çizelge 15: Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri (IV. Düzey)

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 117.000.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 21.820.000,00 TL ödenek ekleme ve 700.000,00 TL ödenek düşülme işlemi yapılmış ve toplam ödenek 138.120.000,00 TL olmuştur. 2019H03-104827 nolu Kampüs Altyapısı, 2024H03-233483 Muhtelif İşler, 2019H03-134615 nolu Derslik ve Merkezi Birimler ile 2023H05-191421 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projeleri kapsamında 126.572.267,00 TL harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı %91,64 olarak gerçekleşmiştir. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına Çizelge-16'te yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.5.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	492.000,00	2023H05-191421	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
06.5.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	11.565.396,19	2019H03-104827	Kampüs Altyapısı
06.5.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	162.000,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.5.70.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Yapım Giderleri	4.920.115,12	2019H03-104827	Kampüs Altyapısı
06.5.70.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Yapım Giderleri	96.766.401,88	2019H03-134615	Derslik ve Merkezi Birimler
06.5.70.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Yapım Giderleri	9.496.828,44	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.5.70.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Yapım Giderleri	3.169.525,37	2023H05-191421	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
06.5.70	Müteahhitlik Giderleri				126.572.267,00
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				126.572.267,00

Çizelge 16: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)



06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL olan 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 745.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 732.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 1.013.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233483 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 983.543,48 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı %97,09 olarak gerçekleşmiştir. 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına Çizelge-17'da yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.6.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	958.663,48	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.6.90.01	Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	4.300,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.6.90.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	20.580,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.6.90	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri				24.880,00
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri				983.543,48

Çizelge 17: Menkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 24.000.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 732.000,00 TL ödenek ekleme ve 7.500.000,00 TL ödenek düşüm işlemi yapılmış olup toplam ödenek 17.232.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233483 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 14.847.037,24 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı %86,16 olarak gerçekleşmiştir. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına Çizelge-18'de yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.7.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	13.492.609,24	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.7.70.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	28.500,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.7.70	Müteahhitlik Giderleri				13.521.109,24
06.7.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer G.Menkul Büyük Onarım Giderleri	450.720,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.7.90.01	MTOSB Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü	Diğer G.Menkul Büyük Onarım Giderleri	732.000,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.7.90	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				1.182.720,00
06.7.20.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Malzeme Giderleri	110.088,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.7.20.03	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sihhi Tesisat Giderleri	30.900,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.7.20.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	2.220,00	2024H03-233483	Muhtelif İşler
06.7.20	Malzeme Giderleri				143.208,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				14.847.037,24

Çizelge 18: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)



2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar *Çizelge-19 ile 24'te* yer almakta olup dağılımı ise *Grafik-4'de* gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2024H03-233485
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2024-2024
2024 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	200.000,00
2023 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2024 Yılı Yatırımı TL	300.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	100.000,00
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	300.000,00
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	300.000,00

Çizelge 19: Revizyon (2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2024H03-233483
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2024-2024
2024 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	60.200.000,00
2023 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2024 Yılı Yatırımı TL	60.200.000.000
Eklenen/Aktarılan TL	6.859.000,00
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	67.059.000,00
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	67.059.000,00

Çizelge 20: Revizyon (2024H03-233483Nolu Muhtelif İşler)



Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2024H03-233486
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2024-2024
2024 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	3.000.000,00
2023 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2024 Yılı Yatırımı TL	1.500.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	1.500.000,00
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	1.500.000,00

Çizelge 21: Revizyon (2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı)

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2019H03-104827
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2019-2025
2024 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	30.690.000,00
2023 Yılı Kümülatif Harcama TL	8.610.000,00
2024 Yılı Yatırımı TL	19.800.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	20.800.000,00
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	40.600.000,00
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	40.600.000,00

Çizelge 22: Revizyon (2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı)




Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2019H03-134615
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2019-2025
2024 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	120.000.000,00
2023 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2024 Yılı Yatırımı TL	92.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	12.120.000,00
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	104.120.000,00
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	120.000.000,00

Çizelge 23: Revizyon (2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler)

Sektörü	Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2023H05-191421
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2023-2025
2024 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	12.000.000,00
2023 Yılı Kümülatif Harcama TL	3.349.000,00
2024 Yılı Yatırımı TL	5.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	500.000,00
2024 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	4.500.000,00
2024 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	12.000.000,00

Çizelge 24: Revizyon (2023H05-191421 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)



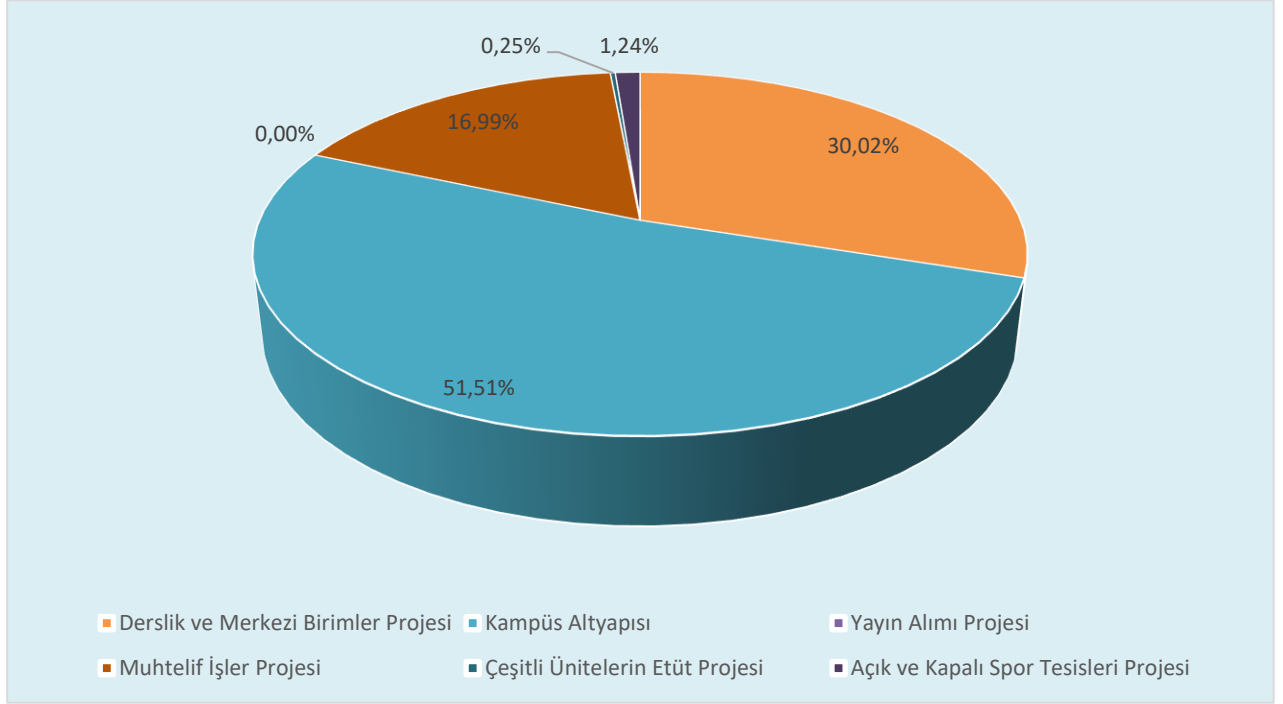

Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı

2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasının da etkisi ile proje revizyonları vb. sebebiyle daha uzun sürmektedir.
- Döviz kurlarındaki istikrarsızlık, enflasyonist ortam, ekonomik gelecek öngörüsünün kolay yapılamaması ve ihale sürecinin uzun sürmesi gibi nedenler, isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte ve maliyet hesabında sorunlara yol açmaktadır.
- Teknik personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, proje hazırlığı ile ihaleye çıkılması arasındaki süre yetersizliği vb. durumlardan dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşmakta ve bu da projelerin revize edilmesine neden olmaktadır.
- Yerel ve küresel ölçekte karşılaşılan ekonomik istikrarsızlıklar yatırım projelerinin ihale edilmesi sürecinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmakta, projelerin maliyet ve süre gibi yönlerden revize edilmesi ve idare ihtiyacının süresinde giderilememesi gibi sonuçlara sebep olmaktadır.



3. PROJE UYGULAMALARI

3.1. 2024H03-233485 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2024 yılı bütçemize 200.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuş olup yıl içinde 100.000,00 TL ekleme yapılmış ve düşüm işlemi yapılmamıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ihalesi ve yapımı planlanan işlerin etüt-proje giderleri için yıl içinde 300.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2024H03-233485 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	200.000,00
Net Eklenen TL	100.000,00
Toplam Ödenek TL	300.000,00
Harcama TL	300.000,00
Kalan Ödenek TL	0,00
Gerçekleşme Oranı %	100,00

Çizelge 25: 2024H03-233485 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

3.2. 2024H03-233483Nolu Muhtelif İşler

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro, okul ve sosyal tesis mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, klima, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı, atölye gereçleri ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım ve işletim sistemi lisans alımları gerçekleştirilmiştir. Elektrik ve sıhhi tesisata yönelik alımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının ve menkul mallarının bakım onarımı yapılmış ve müteahhitlik giderleri gerçekleştirilmiştir. Tümü bunlarla birlikte Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası Yapım İşİ kesin hesap ödemesi de proje kapsamında yapılmıştır.





Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	67.059.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	60.200.000,00
Net Eklenen TL	6.859.000
Toplam Ödenek TL	67.059.000,00
Harcama TL	55.415.115,22
Kalan Ödenek TL	11.643.884,78
Gerçekleşme Oranı %	82,63

Çizelge 26: 2024H03-233483 Nolu Muhtelif İşler Projesi




İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler	Tutarı (TL)
Büro Mefruşatı Alımları	7.008.137,31
Okul Mefruşatı Alımı	302.770,81
Diğer Mefruşat Alımları	512.213,22
Büro Makinaları Alımı	475.406,98
Bilgisayar Alımları	5.770.526,94
Tıbbi Cihaz Alımları	3.692,77
Laboratuvar Cihazı Alımları	2.050.746,3
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	364.992,72
Diğer Makine Teçhizat Alımları	516.577,52
Atölye Gereçleri Alımları	44.880,00
Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	2.646.250,41
Güvenlik Donanımı Cihazları Alımları	2.056.125,43
Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	553.314,36
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	2.297.074,93
Diğer Lisans Alımları	31.838,33
İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	865.510,80
Malzeme Giderleri	958.663,48
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	20.580,00
TOPLAM	26.479.302,38

Çizelge 27: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (İMİDB)





Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Büro Mefruşatı Alımı	73.440,00
Diğer Mefruşat Alımı	1.100.676,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.029.468,00
TOPLAM	2.203.584,00

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (SKSDB)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Diğer Müteahhitlik Giderleri	13.492.609,24
Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	28.500,00
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	450.720,00
Diğer Malzeme Giderleri	110.088,00
Sihhi Tesisat Giderleri	30.900,00
Malzeme Giderleri	2.220,00
TOPLAM	14.115.037,24

Çizelge 24: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (YİTDB)

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.551.736,80
Atölye Gereçleri Alımları	372.186,60
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	247.980,00
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	4.300,00
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	732.000,00
Bilgisayar Alımları	50.159,76
TOPLAM	2.958.363,16

Çizelge 25: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (OSB MYO)



3.3. 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi



Yayın Alımı Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL olup yıl içinde ekleme yapılmamış ve 1.500.000,00 TL düşüm işlemi yapılmıştır. Toplam harcama 1.460.722,14 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı harcamalarının toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı %97,38 olarak gerçekleşmiştir. 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar Çizelge-29'da yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2024
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	1.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	3.000.000,00
Net Eklenen TL	-1.500.000,00
Toplam Ödenek TL	1.500.000,00
Harcama TL	1.460.722,14
Kalan Ödenek TL	39.277,86
Gerçekleşme Oranı %	97,38

Çizelge 26: 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi



2024H03-233486 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	735.006,00
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	725.716,14
TOPLAM	1.460.722,14

Çizelge 27: 2024H03-233486 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

3.4. 2019H03-104827 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 20.000.000,00 TL olup yıl içinde ödenek eklemesi yapılmamış olup ve 200.000,00 TL ödenek düşülmesi yapılmıştır. Toplam ödenek 19.800.000,00 TL olup 16.485.511,00 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019H03-104827 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	40.600.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	20.000.000,00
Net Eklenen TL	-200.000,00
Toplam Ödenek TL	19.800.000,00
Harcama TL	16.485.511,31
Kalan Ödenek TL	3.314.488,69
Gerçekleşme Oranı (%)	83,20

Çizelge 28: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi




2024 yılında ilgili proje kapsamında aşağıda bilgileri bulunan yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Çevre İstinat Duvarı Yapım İşi 1 Nolu Hakediş Ödemesi	1.998.538,96
Genel Çevre Düzenleme İşleri Ödemesi	138.000,00
Çevre İstinat Duvarı Yapım İşi 02 Nolu Hakediş Ödemesi	1.852.856,81
Çevre İstinat Duvarı Yapım İşi 03 Nolu Hakediş Ödemesi	2.895.193,52
Çim Sulama Tesisatı Yapım İşi Hakediş Ödemesi	32.400,00
Yemekhane Lpg Tank Yeri Yapım İşi	66.000,00
Çevre İstinat Duvarı Yapım İşi 04 Nolu Hakediş Ödemesi	2.024.921,60
Yemekhane Terasına Duvar Yapımı Ve Muhtelif Yerlere Toprak Serimi İşi Hakediş Ödemesi	216.000,00
Çevre İstinat Duvarı Yapım İşi 05 Nolu Kesin Ödemesi	563.872,19
İstinat Duvarı Yapım İşi Hakediş Ödemesi	738.000,00
Giriş Kapısı Ve Genel Çevre Düzenleme Yapılması Yapım İşi 01 Nolu Hakediş Ödemesi	1.456.441,12
Mühendislik Fakültesi Çevresi Kaldırım Yapılması İşi Hakediş Ödemesi	600.000,00
Giriş Kapısı Ve Genel Çevre Düzenleme Yapılması Yapım İşi 02 Nolu Hakediş Ödemesi	3.903.287,11
TOPLAM	16.485.511,31


Çizelge 29: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı



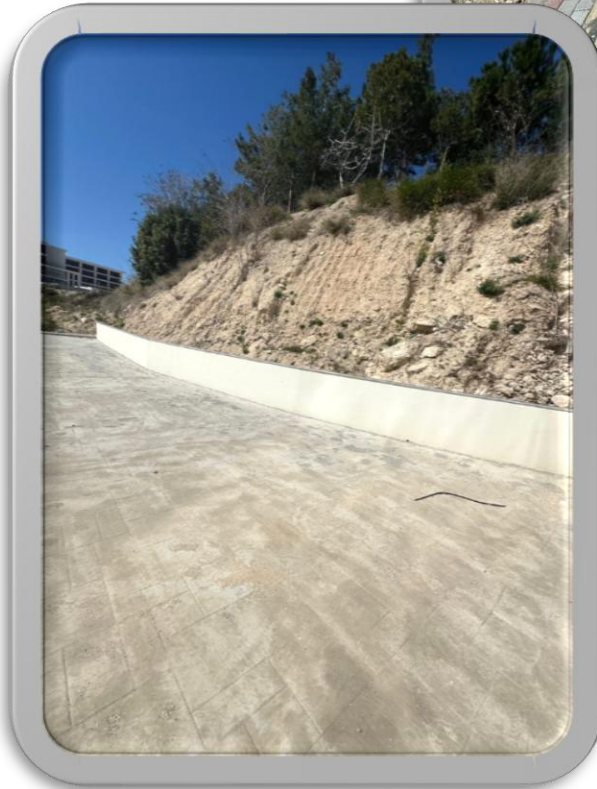

3.4.1. ÇEVRE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ

Sözleşme bedeli 6.666.000,00 TL olan proje 27.11.2023 tarihinde ihale edilerek 03.01.2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. İhalesi 2023 içerisinde yapılmakla birlikte sözleşme ve yer teslimi 2024 yılına sarktığından proje için 2023 yılında harcama gerçekleşmemiş olup 2024 yılı içerisinde teslim edilmiş tamamlanmıştır. Proje tamamlanarak yerleşke bütünlüğü ve güvenliği açısından önemli bir ihtiyacı karşılanması sağlanmıştır.

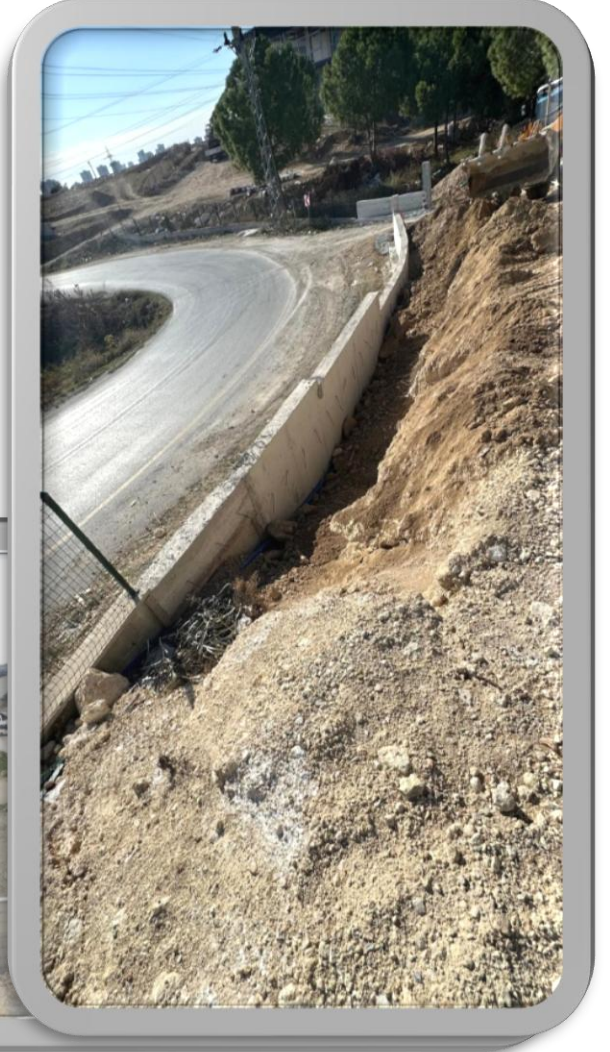

İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Hasan BİLGİÇ
Sözleşmenin Konusu	Çevre İstinat Duvarı Yapım İşİ
Proje Numarası	2019H03-104827
İhale Tarihi	27.11.2023
Sözleşme Tarihi	03.01.2024
Sözleşme Bedeli TL	6.666.000,00 TL
Yer Teslim Tarihi	05.01.2024
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.01.2024
İşin Bitim Tarihi	02.06.2024
Projeye İlgili Revizyonlar	Bulunmamaktadır
Güncel Sözleşme Bedeli	6.666.000,00 TL
Revizyon Nedenleri	Yoktur
2024 Yılı Harcama Tutarı TL	7.931.184,96
Toplam Harcama Tutarı TL	7.931.184,96
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 30: Çevre İstinat Duvarı Yapım İşİ



3.4.2. GİRİŞ KAPISI VE GENEL ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI YAPIM İŞİ

Sözleşme bedeli 5.013.000,00 TL olan proje 19.09.2024 tarihinde ihale edilerek 07.10.2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Yer teslimi 08.10.2024 tarihinde yapılan proje, 21.12.2024 tarihinde tamamlanmış ve proje için 2024 yılında 4.826.077,95 TL harcama gerçekleşmiştir. Geçici kabul süreci 2025 yılına sarktığından projenin kesin hesabı 2025 yılında yapılacaktır. Projenin tamamlanması, yerleşke bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunarak güvenlik açısından önemli bir ihtiyacı karşılamıştır.



İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Benser İnşaat Mühendislik Turizm Nakliyat Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Sözleşmenin Konusu	Giriş Kapısı Ve Genel Çevre Düzenleme Yapılması Yapım İşİ
Proje Numarası	2019H03-104827
İhale Tarihi	19.09.2024
Sözleşme Tarihi	07.10.2024
Sözleşme Bedeli TL	5.013.000,00
Yer Teslim Tarihi	08.10.2024
Fiilen İşe Başlama Tarihi	08.10.2024
İşin Bitim Tarihi	21.12.2024
Projeyle İlgili Revizyonlar	Bulunmamaktadır
Güncel Sözleşme Bedeli	5.013.000,00
Revizyon Nedenleri	Yoktur
2024 Yılı Harcama Tutarı TL	4.826.077,95
Toplam Harcama Tutarı TL	4.826.077,95
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 31: Giriş Kapısı ve Genel Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ



3.5. 2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 92.000.000,00 TL olup, yıl içinde yapılan ekleme 12.120.000,00 TL'dir. Toplam ödenek 104.120.000,00 TL olup 96.766.401,88 TL harcama yapılmıştır. 2019H03-134615 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar Çizelge-34' te yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Eğitim (17.000 m ²)
Alt Projeler	Kütüphane
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	120.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	92.000.000,00
Eklene TL	12.120.000,00
Toplam Ödenek TL	104.120.000,00
Harcama TL	96.766.401,88
Kalan Ödenek	7.353.598,12
Gerçekleşme Oranı (%)	92,94

Çizelge 32: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 1 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1.328.473,15
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 02 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	4.657.414,64
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 03 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	5.982.344,45
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 04 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	14.788.389,83
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 05 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	8.843.575,74
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 06 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	8.107.585,74
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 07 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	8.664.619,92
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 08 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	10.008.712,85
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 09 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	9.629.000,59
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 10 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	10.468.564,31
KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 11 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	14.287.720,66
TOPLAM	96.766.401,88

Çizelge 33: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları(Mühendislik Fakültesi Binası)





3.5.1. KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ

Sözleşme bedeli 79.913.000,00 TL olan proje 04.12.2023 tarihinde ihale edilerek 03.01.2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Yapım süreci devam eden projeye devreye alındığında Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma altyapısını güçlendirecek, öğrenci ve akademisyenlerin basılı ve elektronik yayınlara ve diğer kütüphane hizmetlerine erişimini kolaylaştıracaktır.

İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	BENSER- AZ-GÜN İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ
Proje Numarası	2019H03-134615
İhale Tarihi	04.12.2023
Sözleşme Tarihi	03.01.2024
Sözleşme Bedeli TL	79.913.000,00
Yer Teslim Tarihi	05.01.2024
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.01.2024
İşin Bitim Tarihi	28.04.2025
Projeye İlgili Revizyonlar	Yapılmamıştır.
Güncel Sözleşme Bedeli	79.913.000,00 TL
Revizyon Nedenleri	Yapılmamıştır.
2024 Yılı Harcama Tutarı TL	96.766.401,88
Toplam Harcama Tutarı TL	96.766.401,88
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	90
İnşaatin Durumu	Devam Ediyor

Çizelge 34: Mühendislik Fakültesi Binası Yapım İşİ

3.6. 2023H05-191421 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2024 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup, yıl içinde yapılan ekleme olmamakla birlikte 500.000,00 TL düşülmüştür Toplam ödenek 4.500.000,00 TL olup 3.661.525,37 TL harcama yapılmıştır. 2023H05-191421 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine ait detaylar Çizelge-35 ve Çizelge-37'de yer almaktadır.

Sektörü	Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Spor Tesisleri (5 Adet)
Alt Projeler	Açık Spor Tesisleri
Proje Başlama Yılı	2023
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	12.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	5.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	500.000,00
Toplam Ödenek TL	4.500.000,00
Harcama TL	3.661.525,37
Kalan Ödenek	81,36


Çizelge 35: 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi



Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Myo Kampüsü Spor Tesisleri Yapım İşi 01 Nolu Hakediş Ödemesi	1.667.815,46
Myo Kampüsü Spor Tesisleri Yapım İşi 02 Nolu Hakediş Ödemesi	1.501.709,91
Myo Kampüsünde Halı Saha Etrafına Kilit Parke öe 21 Mtül Çelik Tribün Yapılması İşi Hakediş Ödemesi	492.000,00
TOPLAM	3.661.525,37

Çizelge 36: 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamaları

3.6.1. MYO KAMPÜSÜ SPOR TESİSLERİ YAPIM İŞİ

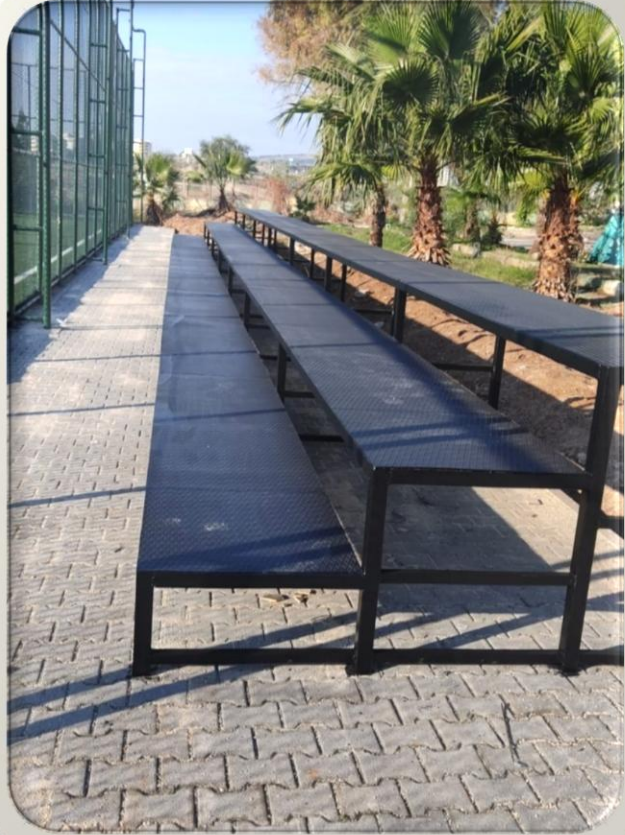

Sözleşme bedeli 2.600.000,00 TL olan proje 23.08.2024 tarihinde ihale edilerek 10.09.2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.

Sözleşmeye uygun biçimde yapımı tamamlanan proje 2024 yılı içerisinde hizmete alınmıştır.



İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Gündüz Altyapı Madencilik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sözleşmenin Konusu	Myo Kampüsü Spor Tesisleri Yapım İşİ
Proje Numarası	2023H05-191421
İhale Tarihi	23.08.2024
Sözleşme Tarihi	10.09.2024
Sözleşme Bedeli TL	2.600.000,00
Yer Teslim Tarihi	11.09.2024
Fiilen İşe Başlama Tarihi	11.09.2024
İşin Bitim Tarihi	08.12.2024
Projeyle İlgili Revizyonlar	Yapılmıştır
Güncel Sözleşme Bedeli	2.641.270,00
Revizyon Nedenleri	İş artışı
2024 Yılı Harcama Tutarı TL	3.169.525,37
Toplam Harcama Tutarı TL	3.169.525,37
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 37: Açık Spor Tesisleri Yapım İşİ



4. STRATEJİK PLAN – YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ

Üniversitemiz 2020 – 2024 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerle yatırım programı ilişkisi aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi oluşmuştur.

Stratejik Amaçlar	Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler
A-4 Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	H-4.1 Kampüste eğitim-öğretim, araştırma ve idari kullanım alanlarını artırmak	Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2024H03-233485	Etüt-Proje	300.000,00	* Tarsus üniv. 5 Dönümlük Alan İçin Yapısal, Bitkisel ve Sulama Planının Hazırlanması ve Giriş Kapısı Çelik Projesinin hazırlanması İşi Hakediş Ödemesi * Basketbol-Voleybol-Açık Sahasının Çelik Mimari Uygulama Ve Statik Projeleri Hizmet Alım İşi Hakediş Ödemesi
A-4 Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	H-4.1 Kampüste eğitim-öğretim, araştırma ve idari kullanım alanlarını artırmak H-4.4 Teknoloji ve bilişim altyapısını güçlendirmek ve olanaklarını artırmak	Eğitim- Yükseköğretim	Muhtelif İşler Projesi	2024H03-233483	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-7(1 Adet)	55.415.115,22	*Büro Mefruşatı Alımları *Okul Mefruşatı Alımı *Diğer Mefruşat Alımları *Büro Makinaları Alımı *Laboratuvar Cihazı Alımları *Tıbbi Cihaz Alımları *Bilgisayar Alımları *Diğer Makine ve Teçhizat Alımları *İşyeri Makine Teçhizat Alımları *Laboratuvar Gereçleri Alımları *Kara Taşıtı Alımları *Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları *İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları *Diğer Fikri Hak Alımları *Diğer Müteahhlik Giderleri *Malzeme Giderleri *Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri
A-4 Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	H-4.3 Eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kütüphane kaynaklarını artırmak	Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı	2024H03-233486	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	1.460.722,14	*Basılı Yayın Alımları ve Yapımları *Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
A-4 Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	H-4.1 Kampüste eğitim-öğretim, araştırma ve idari kullanım alanlarını artırmak	Eğitim- Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	2019H03-104827	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı	16.485.511,31	* Çevre İstinat Duvarı Yapım İşi 1-2-3-4-5 Nolu Hakediş Ödemesi ve Kesin Ödemesi *Genel Çevre Düzenleme İşleri Ödemesi *Çim Sulama Tesisi Yapım İşi Hakediş Ödemesi * Yemekhane Lpg Tank Yeri Yapım İşi * Yemekhane Terasına Duvar Yapımı Ve Muhtelif Yerlere Toprak Serimi İşi Hakeiş Ödemesi * İstinat Duvarı Yapım İşi Hakediş Ödemesi * Giriş Kapısı Ve Genel Çevre Düzenleme Yapılması Yapım İşi 01-02 Nolu Hakediş Ödemesi * Mühendislik Fakültesi Çevresi Kaldırım Yapılması İşi Hakediş Ödemesi
A-4 Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	H-4.1 Kampüste eğitim-öğretim, araştırma ve idari kullanım alanlarını artırmak	Eğitim- Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	2019H03-134615	Eğitim (4.000 m ²)	96.766.401,88	*Kütüphane Binası Yapım İşi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Nolu Hakedişleri Ödemeleri
A-5 Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliğini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak	H-5.3 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik olanakları artırmak	Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2023H05-191421	Spor Tesisi (5 Adet)	3.661.525,37	* Myo Kampüsünde Halı Saha Etrafına Kilit Parke Ve 21 Mtül Çelik Tribün Yapılması İşi Hakediş Ödemesi * Myo Kampüsü Spor Tesisleri Yapım İşi Hak ediş Ödemeleri



5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	Toplama Dahil Ödenekler			Toplama Dahil ve Hariç Ödenekler		
						Program	Revize	Harcama	Program	Revize	Harcama
TARSUS ÜNİ.					241.459.000,00	180.200.000,00	197.279.000,00	167.431.944,05	180.200.000,00	197.279.000,00	167.431.944,05
EĞİTİM					241.459.000,00	180.200.000,00	197.279.000,00	167.431.944,05	180.200.000,00	197.279.000,00	167.431.944,05
Yükseköğretim					229.459.000,00	175.200.000,00	192.779.000,00	164.262.418,68	192.779.000,00	175.200.000,00	164.262.418,68
2019H03-104827	Kampüs Altyapısı	Mersin	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2025	40.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	12.582.224,20	19.800.000,00	19.800.000,00	12.582.224,20
2019H03-104827-104828	Kampüs Altyapısı	Mersin	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2025	40.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	12.582.224,20	19.800.000,00	19.800.000,00	12.582.224,20
2019H03-134615	Derslik ve Merkezi Birimler	Mersin	Eğitim (4.000 m²)	2019-2025	120.000.000,00	92.000.000,00	104.120.000,00	96.766.401,88	92.000.000,00	104.120.000,00	96.766.401,88
2019H03-134615-212683	Kütüphane	Mersin	Eğitim (4.000 m²)	2023-2025	120.000.000,00	92.000.000,00	104.120.000,00	96.766.401,88	92.000.000,00	104.120.000,00	96.766.401,88
2024H03-233483	Muhtelif İşler	Mersin	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Tehizmat	2024-2024	67.059.000,00	60.200.000,00	67.059.000,00	53.489.070,46	60.200.000,00	67.059.000,00	53.489.070,46
2024H03-233483-233484	Muhtelif İşler	Mersin	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Tehizmat	2024-2024	67.059.000,00	60.200.000,00	67.059.000,00	53.489.070,46	60.200.000,00	67.059.000,00	53.489.070,46
2024H03-233485	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Mersin	Etüt-Proje	2024-2024	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
2024H03-233486	Yayın Alımı	Mersin	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.124.722,14	3.000.000,00	1.500.000,00	1.124.722,14
2024H03-233486-233487	Yayın Alımı	Mersin	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.124.722,14	3.000.000,00	1.500.000,00	1.124.722,14
Beden Eğitimi Ve Spor					12.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	3.169.525,37	4.500.000,00	5.000.000,00	3.169.525,37
2023H05-191421	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Mersin	Spor Tesisi (5 adet)	2023-2025	12.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	3.169.525,37	5.000.000,00	4.500.000,00	3.169.525,37
2023H05-191421-191422	Açık Spor Tesisleri	Mersin	Spor Tesisi (5 adet)	2023-2025	12.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	3.169.525,37	5.000.000,00	4.500.000,00	3.169.525,37
Genel Toplam					241.459.000,00	180.200.000,00	197.279.000,00	167.431.944,05	180.200.000,00	197.279.000,00	167.431.944,05



6. ÖNERİLER

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
3. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.
4. Proje ve ihale süreçleri, daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.
5. 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi nedeniyle kamuda tasarruf tedbirlerinin yürürlüğe konulması sebebiyle sosyal donatı-spor tesisi gibi Üniversitemiz ihtiyaçlarının sonraki yıllar yatırım programlarına alınabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmelidir.







TARSUS
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

