





TARSUS
ÜNİVERSİTESİ

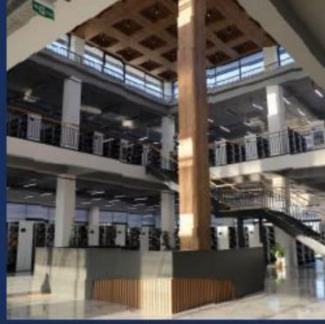

2025

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TARSUS – MART 2026





- Mustafa Kemal ATATÜRK Tarsus Şelalesinde

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.

H. Atatürk





İÇİNDEKİLER	i
ÇİZELGELER TABLOSU.....	ii
1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	iii
2. GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1. MİSYONUMUZ.....	5
2.2. VİZYONUMUZ.....	5
2.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ	5
2.4. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
2.5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	8
2.6. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	9
2.7. 2025 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	11
2.7.1. <i>Hedeflenen</i>	11
2.7.2. <i>Gerçekleşen</i>	12
2.7.3. <i>Devam Eden</i>	12
2.8. 2025 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	13
2.8.1. <i>Genel Yatırım Uygulama Durumu</i>	13
2.8.2. <i>Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri</i>	18
2.8.3. <i>Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar</i>	22
3. PROJE UYGULAMALARI	23
3.1. 2025H03-258645 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	23
3.2. 2025H03-258646 NOLU MUHTELİF İŞLER	23
3.3. 2025H03-258643 NOLU YAYIN ALIMI PROJESİ	28
3.4. 2019H03-104827 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ	29
3.4.1. ÇEVRE DÜZENLEME VE SINIR ÇİTİ YAPILMASI İŞİ	32
3.4.2. Giriş Kapısı ve Genel Çevre Düzenleme Yapılması Yapım İşi	33
3.4.3. TARSUS ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM İŞİ	34
3.5. 2019H03-134615 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	35
3.5.1. <i>Kütüphane Binası Yapım İşi</i>	37
3.6. 2023H05-191421 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ	38
3.6.1. <i>Merkez Kampüs Halı Saha ve Soyunma Odası Yapım İşi</i>	39
4. STRATEJİK PLAN – YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ	41
5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR	42
6. ÖNERİLER	43



ÇİZELGELER TABLOSU

Çizelge 1: Stratejik Amaçlar	6
Çizelge 2: Stratejik Amaç -1 ve Hedefleri	6
Çizelge 3: Stratejik Amaç -2 ve Hedefleri	7
Çizelge 4: Stratejik Amaç - 3 ve Hedefleri	7
Çizelge 5: Stratejik Amaç - 4 ve Hedefleri	7
Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları	8
Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m ²)	9
Çizelge 8: Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)	10
Çizelge 9: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m ²)	11
Çizelge 10: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı	13
Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)	14
Çizelge 12: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)	16
Çizelge 13: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)	16
Çizelge 14: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey).....	17
Çizelge 15: Menkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	17
Çizelge 16: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)	18
Çizelge 17: Revizyon (2025H03-258645 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)	18
Çizelge 18: Revizyon (2025H03-258646 Nolu Muhtelif İşler)	19
Çizelge 19: Revizyon (2025H03-258643 Nolu Yayın Alımı)	19
Çizelge 20: Revizyon (2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı).....	20
Çizelge 21: Revizyon (2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler)	20
Çizelge 22 Revizyon (2023H05-191421 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)	21
Çizelge 23: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (YİTDB)	27
Çizelge 24: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (OSB MYO)	27
Çizelge 25: 2025H03-258643 Nolu Yayın Alımı Projesi	28
Çizelge 26: 2025H03-258643 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı	29
Çizelge 27: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	29
Çizelge 28: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı.....	30
Çizelge 29: Çevre Düzenleme ve Sınır Çiti Yapılması İşİ	32
Çizelge 30: Giriş Kapısı ve Genel Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ.....	33
Çizelge 31: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	35
Çizelge 32: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları(Kütüphane Binası)	35
Çizelge 33: Kütüphane Binası Yapım İşİ.....	37
Çizelge 34: 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi.....	38
Çizelge 35: 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamaları	38
Çizelge 36: Merkez Kampüs Halı Saha ve Soyunma Odası Yapım İşİ.....	40



1. YÖNETİCİ ÖZETİ



Mersin ili Tarsus ilçesinin güzide yükseköğretim kurumu olan Tarsus Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Tarsus Üniversitesi olarak, bir yandan ön lisans düzeyinden doktora programlarına kadar uzanan geniş ve nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleriyle bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlarken, diğer yandan gerçekleştirdiğimiz özgün araştırmalarla bilime, insanlığa ve bölgemizin/ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunmayı temel hedefimiz olarak görmekteyiz.

Tüm paydaşlarımızla birlikte yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversite misyonunu ortaya koymak ve kurumsal farklılaşmayı güçlendirmek amacıyla iş birliklerimizi artırmaktayız. Bu kapsamda kamu kurumları, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Şehir bütünlüğünü en üst seviyeye taşımaya yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmaktayız.

2025 yılında da Üniversitemizin gelişim planı doğrultusunda belirlenen ilk etap projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Kuzey (Merkez) Yerleşkemizde yer alan Kütüphane Binasının inşaa süreci tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bunun yanı sıra mevcut binalarımıza ilişkin revizyon, bakım ve onarım faaliyetlerine de devam edilmiştir.

2025 yılı bütçemizde yatırım amaçlı ayrılan ödenekler incelendiğinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinde niteliğin artırılmasına yönelik politikaların önceliklendirildiği görülmektedir. Bu doğrultuda makine-teçhizat temini, fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yazılım alımları ile öğrencilerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla basılı ve elektronik yayın teminine bütçe kullanımında özel hassasiyet gösterilmiştir.

Üniversitemizin kuruluşunu müteakip açılan akademik birimlerle birlikte, 2025 yılı sonu itibarıyla toplam yedi fakülte, bir yüksekokul, üç meslek yüksekokulu, bir enstitü ve altı uygulama ve araştırma merkezi sayısına ulaşılmıştır.

Bütçe imkânları ve tasarruf anlayışı gözetilerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi ilkesi doğrultusunda 2025 yılında yürütülen yatırım projelerine ilişkin detayların yer aldığı “2025 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” kamuoyunun ve yararlanıcıların bilgisine saygıyla sunulmaktadır. Bu vesileyle çalışmalarda ve raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ali ÖZEN
Rektör





2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Misyonumuz

Tarsus Üniversitesi, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan saygın bir iş birliği içinde toplum yararına hizmet üreten yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir.

2.2. Vizyonumuz

Tarsus Üniversitesinin vizyonu, daima mükemmelin izinde, mensubu olmaktan onur duyulan, saygın bir dünya üniversitesi olmaktır.

2.3. Temel Değerlerimiz

- ✓ Adalet
- ✓ Liyakat
- ✓ İstişare
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Etik değerlere bağlılık
- ✓ Mükemmeliyetçilik
- ✓ Sürekli iyileşmeye açıklık
- ✓ Yenilikçilik ve özgünlük
- ✓ Yerele odaklılık ve küresel rekabetçilik
- ✓ Kurumsal aidiyet



2.4. Temel Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR
Amaç 1: Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek.
Amaç 2: Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak.
Amaç 3: Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek.
Amaç 4: Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik faaliyetleri geliştirmek.

Çizelge 1: Stratejik Amaçlar

AMAÇ 1	HEDEFLER
Eğitim – öğretimin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	Eğitim-Öğretim Programlarının Niteliğini Artırmak
	Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Araştırma-Geliştirme Faaliyetleriyle Bütünleştirmek
	Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmayı Artırmak
	Eğitim-Öğretimin Fiziki ve Donanım Altyapısını Geliştirmek
	Öğrencilerin Bilgi, Beceri ve Yetkinliğini Artırmak
	Öğretim Elemanlarının Eğitime Yönelik Bilgi, Beceri ve Yetkinliğini Artırmak

Çizelge 2: Stratejik Amaç -1 ve Hedefleri



AMAÇ 2	HEDEFLER
Özgün değer katan bilimsel araştırmaların niteliğini ve niceliğini artırmak.	Öğretim Elemanı Başına Düşen Nitelikli Yayın Sayısını Arttırmak
	Öğretim Elemanlarının Araştırmaya Yönelik Bilgi, Beceri ve Yetkinliğini Arttırmak
	Üniversitenin Araştırma Altyapısını Güçlendirmek
	Bilimsel Araştırmalarda Uluslararasılaşma Düzeyini Arttırmak
	Üretilen Bilgi Ve Teknolojinin Ekonomik ve Toplumsal Katkısını Arttırmak

Çizelge 3: Stratejik Amaç -2 ve Hedefleri

AMAÇ 3	HEDEFLER
Kurumsal Kapasiteyi ve İşleyişi Geliştirmek	Üniversite İdari Personelinin Niteliğini Geliştirmek
	Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetleri Arttırmak
	Kurumsallaşmayı Geliştirmek

Çizelge 4: Stratejik Amaç - 3 ve Hedefleri

AMAÇ 4	HEDEFLER
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Faaliyetleri Geliştirmek	Sosyal Sorumluluk, Kültür ve Çevre Bilincine Yönelik Faaliyetleri Arttırmak
	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkıda Bulunan Araştırmaları Arttırmak
	Üniversitenin Ekolojik Ayak İzini Azaltmak
	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkıda Bulunan Eğitim-Öğretim ve Öğrenme Faaliyetlerini Arttırmak

Çizelge 5: Stratejik Amaç - 4 ve Hedefleri



2.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna bağlı (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan özel bütçeli bir idaredir.

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 230.000.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ve tenkis edilen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 239.183.000,00 TL olmuştur. Projelerin sektöre göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	Önceki Yıla Kadar Kümülatif Harcama	2025 Yılı Program Ödeneği	2025 Yılı Revizeli Ödenek	2025 Yılı Harcama
Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2.000.000,00	0,00	1.000.000	2.000.000	1.200.000,00
Eğitim- Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	73.461.000	23.961.000	49.500.000	49.500.000,00	28.333.902,39
Eğitim- Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	344.000.000	96.000.000	90.000.000	73.000.000,00	21.704.979,53
Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı	5.000.000	0,00	5.000.000	5.000.000	3.059.496,99
Eğitim- Yükseköğretim	Muhtelif İşler	101.683.000	0,00	79.500.000	101.683.000	72.353.100,32
Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	14.469.000	6.469.000	5.000.000	8.000.000,00	5.904.546,76
TOPLAM		540.613.000,00	126.430.000,00	230.000.000,00	239.183.000,00	132.556.025,99

Çizelge 6: Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları




2.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin taşınmaz varlığı aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Taşınmazların % 88'ü Kuzey Yerleşkesinde, yaklaşık %12'si diğer yerleşkelerde yer almaktadır.

Yerleşke Adı	Taşınmaz Maliki	Alan
Kuzey Yerleşkesi	Maliye Hazinesi	187.330,32
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi*	Tarsus Üniversitesi	23.086,00
OSB Yerleşkesi	Mersin Tarsus OSB Müdürlüğü	2.000,00
Genel Toplam		212.416,32

Çizelge 7: Taşınmazların Dağılımı (m²)

* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinin hizmete alma süreci devam etmektedir.

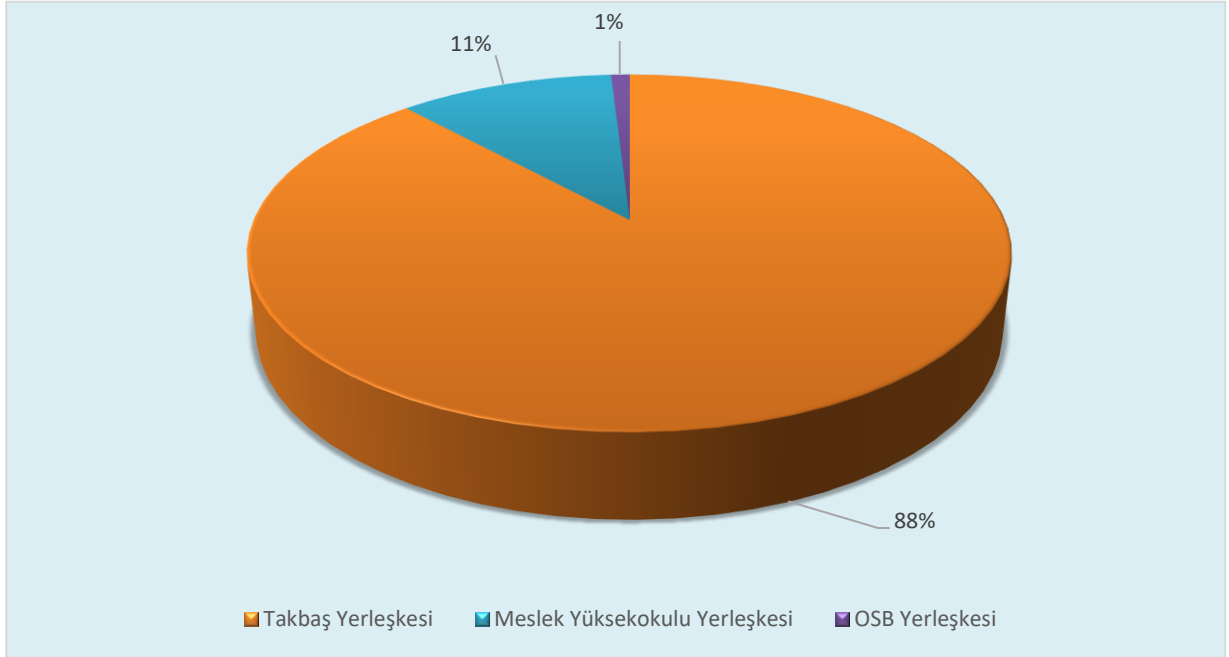

Grafik 1: Taşınmazların Yerleşke İtibariyle Dağılımı




Üniversitemizin kapalı mekânlarının hizmet alan bilgileri aşağıdaki çizelgede yer almakta olup dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Hizmet Alanı	Kuzey Yerleşkesi	Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	OSB Yerleşkesi	Toplam
İdari	6.000,75	0	535,9	6.536,65
Eğitim	6.750,59	0	1.021,87	7.772,46
Sosyal	1.718,57	0	0	1.718,57
Spor	0,00	0	0	0
Diğer	15.659,69	6.859,00	813,37	23.332,06
Genel Toplam	30.129,60	6.859,00	2.371,14	39.359,74

Çizelge 8: Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi hizmete alım süreci devam ettiğinden alanların dağılımı yapılmamıştır.

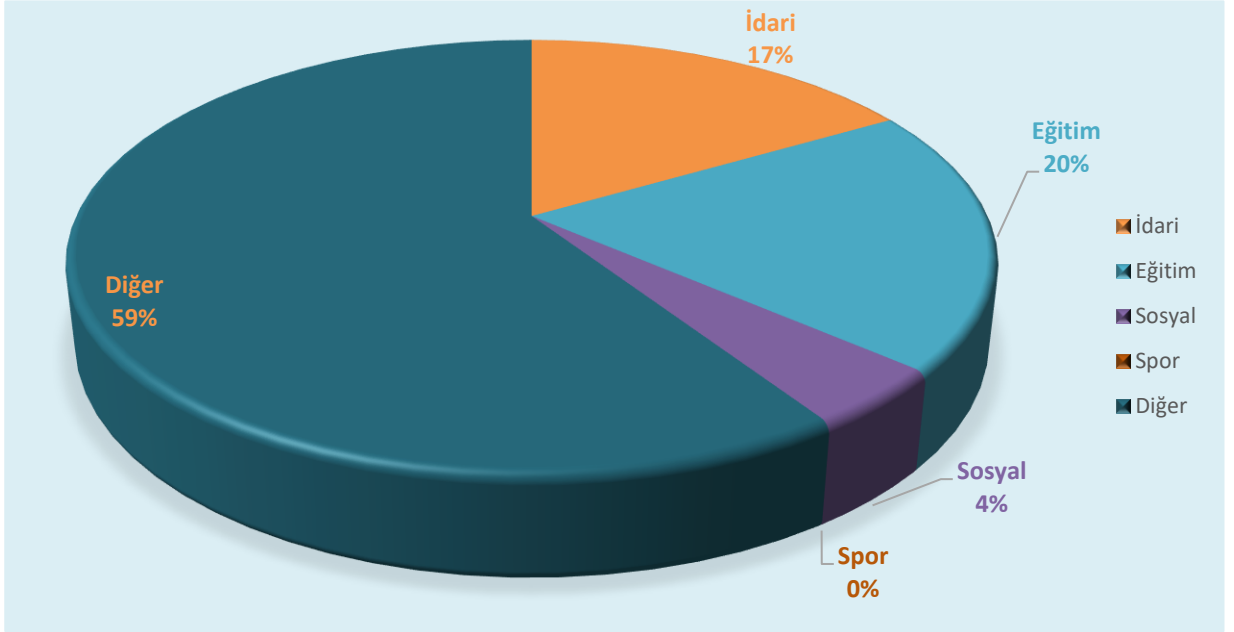

Grafik 2: Taşınmazların hizmet alanları itibarıyla dağılımı



Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Hizmet Alanı	İdari	Eğitim	Spor	Sosyal	Diğer
A Blok	832,13	1.298,72	0,00	0,00	2.128,62
B Blok	1.735,52	1.592,76	0,00	213,36	2.857,68
C Blok	1.069,22	1.337,67	0,00	0,00	1.444,90
Konferans Salonu	0,00	0,00	0,00	400,61	0,00
Mühendislik Fakültesi (A)	486,00	1.664,80	0,00	0,00	1.490,80
Mühendislik Fakültesi (B)	945,00	194	0,00	0,00	2.107,45
Mühendislik Fakültesi (C)	0,00	0,00	0,00	243,00	206,00
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	450,00	591,00	0,00	0,00	1.412,00
Kütüphane Binası	261,88	71,64	0,00	0,00	3.268,64
Tarsus Üniversitesi Göl Kafe Binası	0,00	0,00	0,00	33,40	20,00
Yemekhane Binası	0,00	0,00	0,00	796,00	511,60
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası	159,00	0,00	0,00	32,20	101,00
Organize Sanayi Bölgesi MYO Yerleşkesi	520,90	610,52	0,00	0,00	387,02
Organize Sanayi Bölgesi MYO Laboratuvar Binası	15,00	411,35	0,00	0,00	426,35
Merkezi İmalat Atölye Binası	62,00	0,00	0,00	0,00	111,00
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	6.859,00				
TOPLAM	6.536,65	7.772,46	0,00	1.718,57	23.332,06
GENEL TOPLAM	39.359,74				

Çizelge 9: Üniversitemiz Kapalı Mekânların Dağılımı (m²)

* Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi hizmete alma süreci devam ettiğinden alanların dağılımı yapılmamıştır.

2.7. 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.7.1. Hedeflenen

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım programında eğitim-yükseöğretim sektöründe beş, beden eğitimi ve spor sektöründe bir adet olmak üzere toplam altı adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt-projelerin hazırlanması hedeflenmiştir. 2025 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.



2.7.2. Gerçekleşen

2025 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- ✓ Üniversitemiz çevre düzenleme ve giriş kapısı yapım işinin %100'ü tamamlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Kütüphane Binası yapım işinin %100'ü tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.
- ✓ Üniversitemiz çevre istinat duvarı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale edilmiş olup yapım işi tamamlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve bina mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, klima, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük – küçük bakım onarımları yaptırılmıştır.
- ✓ 2025 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın niteliğinin stratejik planımızda hedeflenen seviyeye ulaşması için gerekli alımlar gerçekleştirilmiştir.

2.7.3. Devam Eden

Üniversitemiz yerleşkelerinde yürütülmekte olan Muhtelif İnşaat Yapım İşleri kapsamında; Atık ve Hurda Deposu yapımı, Yürüyüş Parkuru yapımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yemekhane Tadilatı, otopark gölgelik imalatı, araç girişi mimari düzenleme çalışmaları, kuru dere ıslahı, yürüyüş parkuru ile birlikte kaldırım ve asfalt yol imalatları ile kanalizasyon altyapı imalatlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu iş kalemlerine ilişkin yapım faaliyetleri, onaylı proje ve teknik şartnamelere uygun olarak yüklenici firma tarafından sürdürülmekte olup çalışmalar planlanan iş programı çerçevesinde ilerlemektedir. İşin tamamlanmasını müteakip geçici kabul işlemlerinin 2026 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.




2.8. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 230.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde net ödenek eklemeleriyle birlikte yılsonu ödenek toplamı 239.183.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 132.556.025,99 TL'si harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 55,42 olmuştur. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelge ve grafikte gösterilmiştir. Sermaye Giderleri gerçekleştirmelerinin %34,00'ü mamul mal alımları, %13,00'ünü gayri maddi hak alımları, %43,00'ü gayrimenkul sermaye üretim giderleri, %1,00'i menkul malların büyük onarım giderleri, %9,00 'ini gayrimenkul büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.

Ekonomik Kod	Başlangıç Ödeneği	Net Eklenen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcamanın Toplam Ödeneğe Oranı
06.1	56.000.000,00	10.540.000,00	61.978.000,00	44.412.043,28	71,66 %
06.3	5.000.000,00	14.569.000,00	19.569.000,00	17.509.914,00	89,47 %
06.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.5	145.000.000,00	3.000.000,00	131.000.000,00	56.406.428,68	43,06 %
06.6	1.000.000,00	2.886.000,00	3.636.000,00	1.924.953,91	52,94 %
06.7	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	12.302.686,12	53,49 %
Toplam	230.000.000,00	30.995.000,00	239.183.000,00	132.556.025,99	55,42 %

Çizelge 10: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı

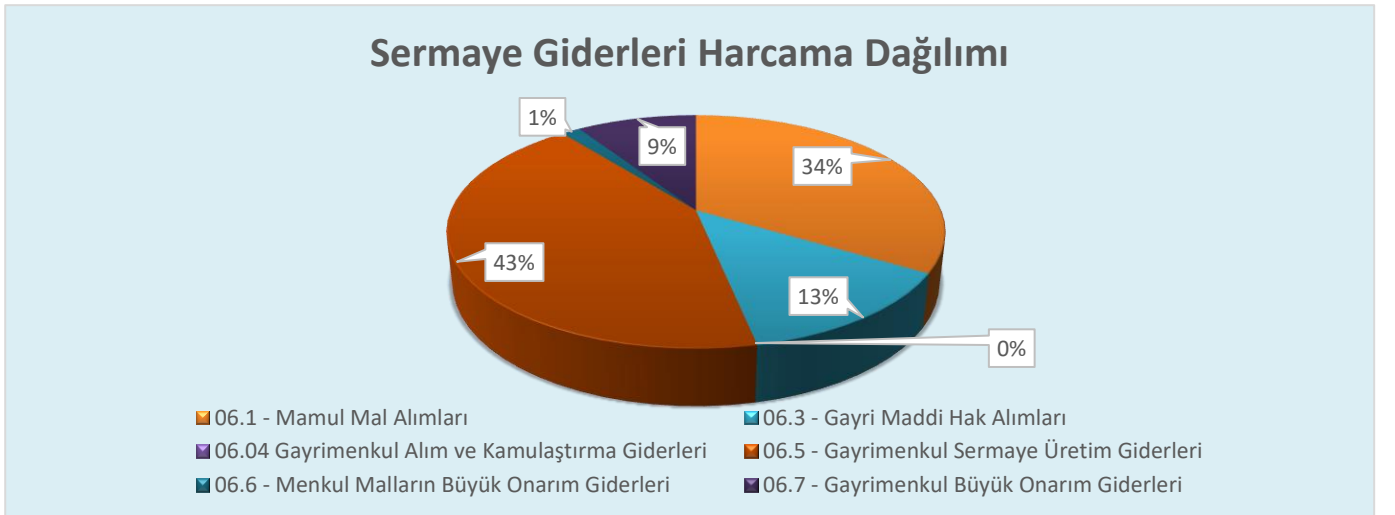

Grafik 3: Sermaye Giderlerinin Dağılımı



Sermaye giderlerine ilişkin 2025 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Ekonomik Kod				Açıklama	Tutar
I	II	III	IV		
06	01	10	01	Büro Mefruşatı Alımları	11.068.432,02
06	01	10	03	Okul Mefruşatı Alımları	6.048.328,01
06	01	10	90	Diğer Mefruşat Alımları	621.294,75
06	01	10		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	17.738.054,78
06	01	20	01	Büro Makinaları Alımları	4.765.789,60
06	01	20	03	Tıbbi Cihaz Alımları	113.689,40
06	01	20	04	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.947.479,20
06	01	20	05	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	4.026.541,41
06	01	20	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.356.918,14
06	01	20		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	12.210.417,75
06	01	30	90	Diğer Avadanlık Alımları	1.512,50
06	01	30	04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	563.431,01
06	01	30	02	Atölye Gereçleri Alımları	301.440,00
06	01	30		Avadanlık Alımları	866.383,51
06	01	60	01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	549.902,42
06	01	60	03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	2.509.594,57
06	01	60		Yayın Alımları ve Yapımları	3.059.496,99
06	01	80	04	Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	997.165,23
06	01	80	03	Bilgisayar Alımları	7.891.304,06
06	01	80	01	Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	1.649.220,96
06	01	80		Bilişim Donanım Alımları	10.537.690,25
06	01			Mamul Mal Alımları	44.412.043,28
06	03	10	01	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	11.405.320,13
06	03	10		Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri	11.405.320,13
06	03	20	02	Plan Proje Alımları	1.200.000,00
06	03	20		Harita Plan Proje Alımları	1.200.000,00
06	03	30	90	Diğer Lisans Alımları	3.539.469,97
06	03	30	02	Ağ Yazılımları Lisans Alımları	871.803,90
06	03	30	01	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	493.320,00
06	03	30		Lisans Alımları	4.904.593,87
06	03			Gayri Maddi Hak Alımları	17.509.914,00
06	05	70	90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	33.757.049,15
06	05	70	01	Hizmet Binası Yapım Giderleri	21.704.979,53
06	05	70		Müteahhitlik Giderleri	55.462.028,68
06	05	30	03	Yük Taşıma Giderleri	944.400,00
06	05	30		Taşıma Giderleri	944.400,00
06	05			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	56.406.428,68
06	06	20	01	Malzeme Giderleri	454.723,20
06	06	20		Malzeme Giderleri	454.723,20
06	06	90	01	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	1.470.230,71
06	06	90		Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	1.470.230,71
06	06			Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	1.924.953,91
06	07	90	01	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.474.800,00
06	07	90		Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.474.800,00
06	07	70	90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	10.328.956,12
06	07	70		Müteahhitlik Giderleri	10.328.956,12
06	07	20	90	Diğer Malzeme Giderleri	355.530,00
06	07	20	03	Sihhi Tesisat Giderleri	101.760,00
06	07	20	01	Malzeme Giderleri	41.640,00
06	07	20		Malzeme Giderleri	498.930,00
06	07			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	12.302.686,12
06				Sermaye Giderleri	132.556.025,99

Çizelge 11: Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımı Detayı (IV. Düzey)



06.1 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 56.000.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımları için yıl içinde 10.540.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 4.562.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 61.978.000,00 TL olmuştur. 2025H03-258646 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 41.352.546,29 TL, 2025H03-258643 nolu Yayın Alımı projesi kapsamında ise 3.059.496,99 TL harcama yapılmıştır. Bu iki projenin toplam harcaması 44.412.043,28 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 71,66 olarak gerçekleşmiştir. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki çizelgede yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımı	11.068.432,02	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.10.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	6.029.492,01	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.10.03	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Okul Mefruşatı Alımı	18.836,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.10.90	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	291.600,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.10.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımı	329.694,75	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.10	Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları				17.738.054,78
06.1.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımı	4.765.789,60	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.20.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Alımları	113.689,40	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.20.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.388.800,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.20.04	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Laboratuvar Cihazı Alımları	558.679,20	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.20.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	3.867.997,41	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.20.05	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	158.544,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.20.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	900.702,14	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.20.90	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Diğer Makine Teçhizat Alımları	456.216,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.20	Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları				12.210.417,75
06.01.30.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Avadanlık Alımları	1.512,50	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.30.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Gereçleri Alımları	113.551,01	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.30.04	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Laboratuvar Gereçleri Alımları	449.880,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.30.02	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Atölye Gereçleri Alımları	301.440,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.30	Avadanlık Alımları				866.383,51
06.1.60.01	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	549.902,42	2025H03-258643	Yayın Alımı



Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.1.60.03	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	2.509.594,57	2025H03-258643	Yayın Alımı
06.1.60	Yayın Alımları ve Yapımları			3.059.496,99	
06.1.80.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	997.165,23	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.80.03	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	7.891.304,06	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.80.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	1.649.220,96	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.1.80	Bilişim Donanım Alımları			10.537.690,25	
06.1	Mamul Mal Alımları			44.412.043,28	

Çizelge 12: Mamul Mal Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olan 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için yıl içinde 14.569.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 19.569.000,00 TL olmuştur. 2025H03-258646 nolu Muhtelif İşler Projeleri kapsamında 16.309914,00 TL harcanmış , 2025H03-258645 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında 1.200.000,00 TL harcanmış ve harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 89,48 olarak gerçekleşmiştir. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına Çizelge-13'de yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.3.10.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	11.165.320,13	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.3.10.01	Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	240.000,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.3.10	Bilgisayar Yazılımı Alımları			11.405.320,13	
06.3.20.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Plan Proje Alımları	1.200.000,00	2025H03-258645	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
06.3.20	Harita Plan Proje Alımları			1.200.000,00	
06.3.30.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Diğer Lisans Alımları	3.539.469,97	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.3.30.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Ağ Yazılımları Lisans Alımları	871.803,90	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.3.30.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	493.320,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.3.30	Lisans Alımları			4.904.593,87	
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları			17.509.914,00	

Çizelge 13: Gayri Maddi Hak Alımları Harcama Detayı (IV. Düzey)



06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 145.000.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için yıl içinde 3.000.000,00 TL ödenek ekleme ve 17.000.000,00 TL ödenek düşülme işlemi yapılmış ve toplam ödenek 131.000.000,00 TL olmuştur. 2019H03-104827 nolu Kampüs Altyapısı, 2024H03-233483 Muhtelif İşler, 2019H03-134615 nolu Derslik ve Merkezi Birimler ile 2023H05-191421 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projeleri kapsamında 56.406.428,00 TL harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 43,06 olarak gerçekleşmiştir. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerini ilişkin harcama detayına Çizelge-14'de yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.5.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	5.904.546,76	2023H05-191421	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
06.5.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	27.389.502,39	2019H03-104827	Kampüs Altyapısı
06.5.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	463.000,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.5.70.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Yapım Giderleri	21.704.979,53	2019H03-134615	Derslik ve Merkezi Birimler
06.5.70	Müteahhitlik Giderleri				55.462.028,68
06.5.30.03	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yük Taşıma Giderleri	944.400,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.5.30	Taşıma Giderleri				944.400,00
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri				56.406.428,68

Çizelge 14: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL olan 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde 2.286.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 250.000,00 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 3.636.000,00 TL olmuştur. 2025H03-258646 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 1.924.953,91 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 63,40 olarak gerçekleşmiştir. 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına Çizelge-15'de yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.6.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	84.000,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.6.20.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	248.460,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.6.20	Malzeme Giderleri				454.723,20
06.6.90.01	Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	122.263,20	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.6.90.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	1.305.362,71	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.6.90.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	164.868,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.6.90	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri				1.470.230,71
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri				1.924.953,91

Çizelge 15: Menkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)



06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 23.000.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için yıl içinde ödenek ekleme ve ödenek düşüm işlemi yapılmamış olup toplam ödenek 23.000.000,00 TL olmuştur. 2024H03-233483 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında 14.847.037,24 TL harcanmış olup harcamanın yılsonu ödeneğine göre oranı % 64,55 olarak gerçekleşmiştir. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına Çizelge-16'da yer verilmiştir.

Ekonomik Kod	Alımı Gerçekleştiren Birim	Açıklama	Harcama Tutarı (TL)	Proje No	Projenin Adı
06.7.70.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.474.800,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.7.70	Müteahhitlik Giderleri				1.474.800,00
06.7.90.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer G.Menkul Büyük Onarım Giderleri	10.328.956,12	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.7.90	Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				10.328.956,12
06.7.20.90	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Malzeme Giderleri	355.530,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.7.20.03	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Sihhi Tesisat Giderleri	101.760,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.7.20.01	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Malzeme Giderleri	41.640,00	2025H03-258646	Muhtelif İşler
06.7.20	Malzeme Giderleri				498.930,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				12.302.686,12

Çizelge 16: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Detayı (IV. Düzey)

2.8.2. Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar Çizelge-17 ile 22'te yer almakta olup dağılımı ise Grafik-4'de gösterilmiştir.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2025H03-258645
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Yılı	2025-2025
2025 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	1.000.000,00
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2025 Yılı Yatırımı TL	1.000.000,00
Eklenecek/Aktarılan TL	1.000.000,00
2025 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	2.000.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	2.000.000,00

Çizelge 17: Revizyon (2025H03-258645 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi)



Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2025H03-258646
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama-Bitiş Yılı	2025-2025
2025 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	79.500.000,00
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2025 Yılı Yatırımı TL	79.500.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	22.183.000,00
2025 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	101.683.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	101.683.000,00

Çizelge 18: Revizyon (2025H03-258646 Nolu Muhtelif İşler)

Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2025H03-258643
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Yılı	2025-2025
2025 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	5.000.000,00
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2025 Yılı Yatırımı TL	5.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	0,00
2025 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	5.000.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	5.000.000,00

Çizelge 19: Revizyon (2025H03-258643 Nolu Yayın Alımı)



Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2019H03-104827
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama-Bitiş Yılı	2019-2025
2025 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	73.461.000,00
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	23.961.000,00
2025 Yılı Yatırımı TL	49.500.000,00
Eklene/Aktarılan TL	0,00
2025 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	73.461.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	49.500.000,00

Çizelge 20: Revizyon (2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı)


Sektörü	Eđitim-Yükseköđretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2019H03-134615
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama-Bitiş Yılı	2019-2025
2025 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	361.000.000,00
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	96.000.000,00
2025 Yılı Yatırımı TL	90.000.000,00
Eklene/Aktarılan TL	17.000.000,00
2025 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	344.000.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	73.000.000,00

Çizelge 21: Revizyon (2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler)



Sektörü	Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Proje No	2023H05-191421
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Başlama-Bitiş Yılı	2023-2025
2025 Yılı Yatırım Teklifi Proje Tutarı TL	11.469.000,00
2024 Yılı Kümülatif Harcama TL	6.469.000,00
2025 Yılı Yatırımı TL	5.000.000,00
Eklenen/Aktarılan TL	3.000.000,00
2025 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	14.469.000,00
2025 Yılı Yatırımı Revizyonu TL	8.000.000,00

Çizelge 22 Revizyon (2023H05-191421 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri)

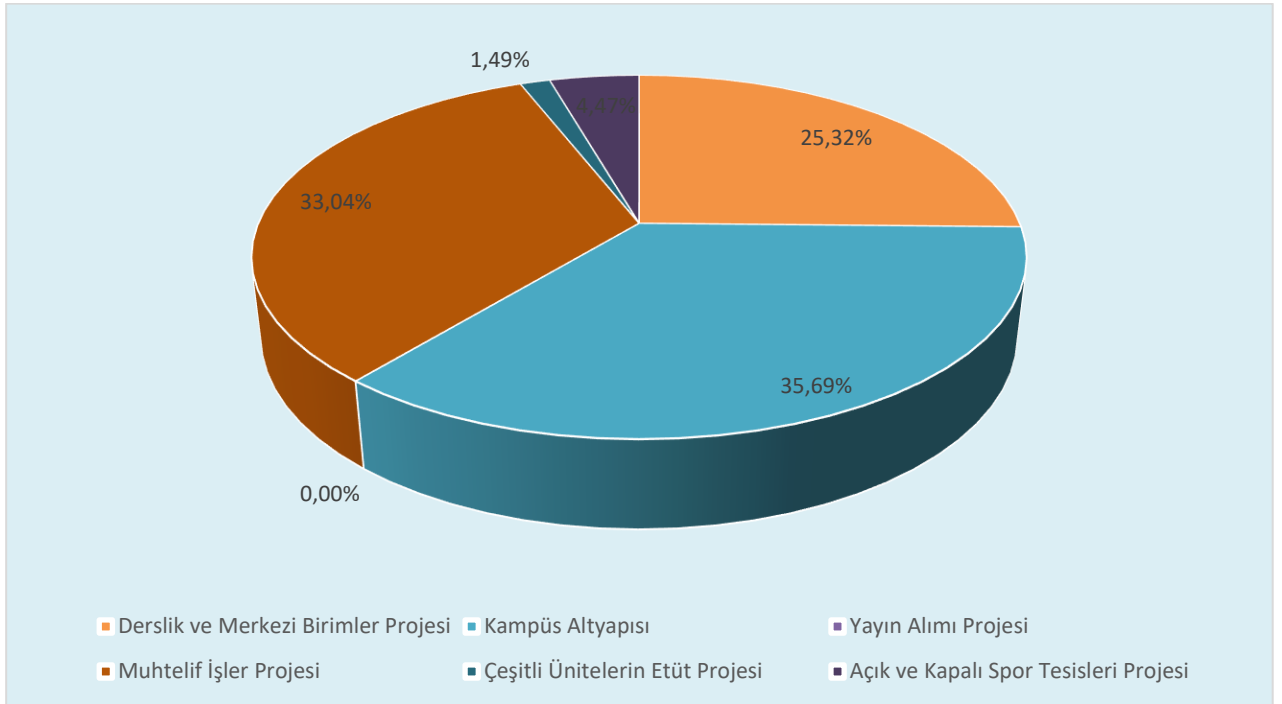

Grafik 4: Yapılan Revizyonların Proje Bazında Dağılımı



2.8.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasının da etkisi ile proje revizyonları vb. sebebiyle daha uzun sürmektedir.
- Döviz kurlarındaki istikrarsızlık, enflasyonist ortam, ekonomik gelecek öngörüsünün kolay yapılamaması ve ihale sürecinin uzun sürmesi gibi nedenler, isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte ve maliyet hesabında sorunlara yol açmaktadır.
- Teknik personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, proje hazırlığı ile ihaleye çıkılması arasındaki süre yetersizliği vb. durumlardan dolayı uygulamada sorunlarla karşılaşmakta ve bu da projelerin revize edilmesine neden olmaktadır.
- Yerel ve küresel ölçekte karşılaşılan ekonomik istikrarsızlıklar yatırım projelerinin ihale edilmesi sürecinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmakta, projelerin maliyet ve süre gibi yönlerden revize edilmesi ve idare ihtiyacının süresinde giderilememesi gibi sonuçlara sebep olmaktadır.



3. PROJE UYGULAMALARI

3.1. 2025H03-258645 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2025 yılı bütçemize 1.000.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneği konulmuş olup yıl içinde 1.000.000,00 TL ekleme yapılmış ve düşüm işlemi yapılmamıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ihalesi ve yapımı planlanan işlerin etüt-proje giderleri için yıl içinde 1.200.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2025H03-258645 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2025
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	2.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	1.000.000,00
Net Eklenen TL	1.000.000,00
Toplam Ödenek TL	2.000.000,00
Harcama TL	1.200.000,00
Kalan Ödenek TL	800.000,00
Gerçekleşme Oranı %	% 60,00

Çizelge 25: 2025H03-258645 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

3.2. 2025H03-258646 Nolu Muhtelif İşler

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro, okul ve sosyal tesis mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, klima, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı, atölye gereçleri ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım ve işletim sistemi lisans alımları gerçekleştirilmiştir. Elektrik ve sıhhi tesisata yönelik alımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının ve menkul mallarının bakım onarımı yapılmış ve müteahhitlik giderleri gerçekleştirilmiştir.





Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2025
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	79.500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	73.500.000,00
Net Eklenen TL	6.000.000,00
Toplam Ödenek TL	79.500.000,00
Harcama TL	53.175.676,41
Kalan Ödenek TL	26.324.323,59
Gerçekleşme Oranı %	% 66,89

Çizelge 26: 2025H03-258646 Nolu Muhtelif İşler Projesi




İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler	Tutarı (TL)
Büro Mefruşatı Alımları	11.068.432,02
Okul Mefruşatı Alımı	6.029.492,01
Diğer Mefruşat Alımları	329.694,75
Büro Makinaları Alımı	4.765.789,60
Bilgisayar Alımları	7.891.304,06
Tıbbi Cihaz Alımları	113.689,40
Laboratuvar Cihazı Alımları	1.388.800,00
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	3.867.997,41
Diğer Makine Teçhizat Alımları	900.702,14
Laboratuvar Gereçleri Alımları	113.551,01
Diğer Avadanlık Alımları	1.512,50
Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	997.165,23
Ağ Altyapısı Cihazları Alımları	1.649.220,96
Bilgisayar Alımları	7.891.304,06
Bilgisayar Çevre Birimleri Alımları	997.165,23
Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri	11.165.320,13
İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	493.320,00
Ağ Yazılımları Lisans Alımları	871.803,90
Diğer Lisans Alımları	3.539.469,97
Malzeme Giderleri	248.460,00
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	1.305.362,71
TOPLAM	56.741.087,80

Çizelge 27: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (iMiDB)



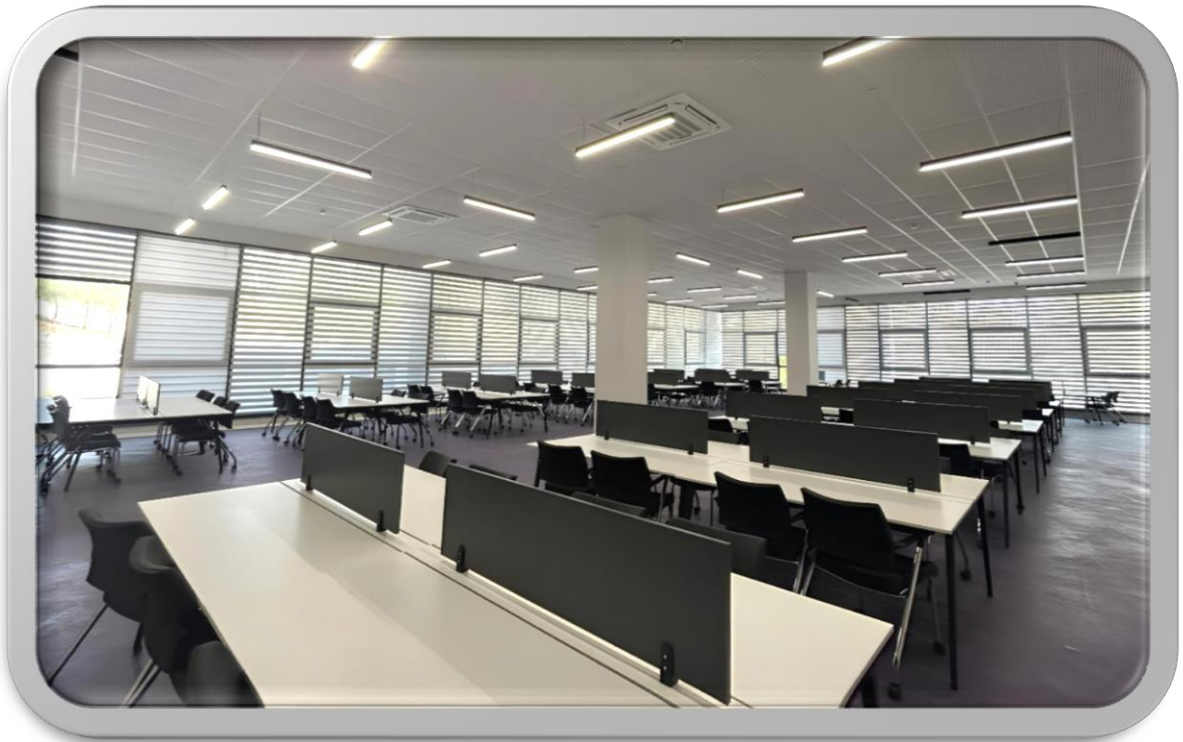

Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Okul Mefruşatı Alımları	18.836,00
Diğer Mefruşat Alımları	291.600,00
TOPLAM	310.436,00

Çizelge 28: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (SKSDB)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
İnşaat Malzemesi Giderleri	41.640,00
Sihhi Tesisat Giderleri	101.760,00
Diğer Malzeme Giderleri	355.530,00
Müteahhitlik Giderleri	9.849.400,12
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.474.800,00
Malzeme Giderleri	84.000,00
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	164.868,00
TOPLAM	14.115.037,24

Çizelge 23: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (YİTDB)


Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. (Bahse konu giderler YÖK desteği kapsamında finanse edilmiştir.)

Alınan Malzemeler ve Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Laboratuvar Cihazı Alımları	558.679,20
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	158.544,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	456.216,00
Atölye Gereçleri Alımları	301.440,00
Laboratuvar Gereçleri Alımları	449.880,00
Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Geliştirme Giderleri	240.000,00
Malzeme Giderleri	122.263,20
TOPLAM	2.287.022,40

Çizelge 24: Muhtelif İşler Projesi kapsamında alınan malzemeler ve yapılan işler (OSB MYO)



3.3. 2025H03-258643 Nolu Yayın Alımı Projesi

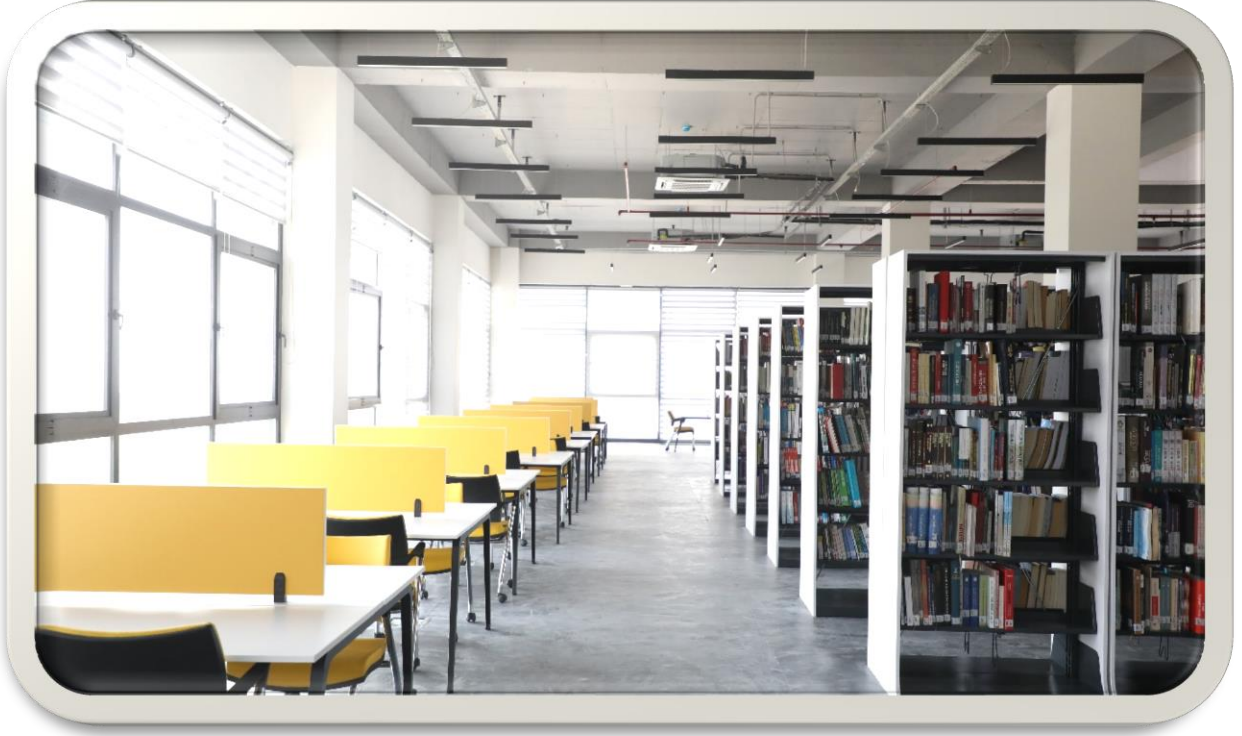

Yayın Alımı Projesi için 2025 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup yıl içinde ekleme ve düşüm işlemi yapılmamıştır. Toplam harcama 3.059.496,99 TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı harcamalarının toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 61,19 olarak gerçekleşmiştir. 2025H03-258643 Nolu Yayın Alımı Projesine ait detaylar Çizelge-25'da yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2025
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	5.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	5.000.000,00
Net Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	5.000.000,00
Harcama TL	3.059.496,99
Kalan Ödenek TL	1.940.503,01
Gerçekleşme Oranı %	61,19

Çizelge 25: 2025H03-258643 Nolu Yayın Alımı Projesi



2025H03-258643 nolu Yayın Alımı Projesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. Harcamaların tamamı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	549.902,42
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	2.509.594,57
TOPLAM	3.059.496,99

Çizelge 26: 2025H03-258643 Nolu Yayın Alımı Projesi Harcamalarının Detayı

3.4. 2019H03-104827 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi için 2025 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 49.500.000,00 TL olup yıl içinde ödenek eklemesi ve düşülmesi yapılmamış olup toplam ödenek 49.500.000,00 TL olup 28.333.902,39 TL harcama gerçekleşmiştir. 2019H03-104827 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	73.461.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	49.500.000,00
Net Eklenen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	49.500.000,00
Harcama TL	28.333.902,39
Kalan Ödenek TL	11.166.097,61
Gerçekleşme Oranı (%)	57,24

Çizelge 27: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi




2025 yılında ilgili proje kapsamında aşağıda bilgileri bulunan yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
GİRİŞ KAPISI VE GENEL ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI 03 NOLU SON HAKEDİŞİ	731.553,46
YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI İŞİNİN HAKEDİŞ ÖDEMESİ	486.000,00
MUHTELİF İNŞAAT YAPIM İŞİ 01 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	4.651.562,59
MUHTELİF İNŞAAT YAPIM İŞİ 02 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	3.599.440,79
MUHTELİF İNŞAAT YAPIM İŞİ 03 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	5.660.403,74
KÜTÜPHANE ÇEVRESİ PEYZAJ DÜZENLEME İŞİNİN ÖDEMESİ	428.280,00
KANALİZASYON HATTI VE GENEL ALTYAPI İŞLERİ İŞİNİN HAKEDİŞ ÖDEMESİ	408.000,00
ÇEVRE DÜZENLEME VE SINIR ÇİTİ YAPILMASI İŞİNİN 01 NOLU HAKEDİŞİ	2.741.228,10
ÇEVRE DÜZENLEME VE SINIR ÇİTİ YAPILMASI İŞİNİN 02 NOLU HAKEDİŞİ	1.498.665,12
ÇEVRE DÜZENLEME VE SINIR ÇİTİ YAPILMASI İŞİNİN 03 NOLU HAKEDİŞİ	3.437.133,32
ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SINIR ÇİTİ YAPIM İŞİ 04 NOLU VE SON HAKEDİŞ ÖDEMESİ	3.399.235,27
GENEL ALTYAPI İŞLERİ HAKEDİŞ ÖDEMESİ	348.000,00
MEVCUT HARFİYATLARIN TAŞINIP SERİLİP SIKIŞTIRILMASI İŞİNİN HAKEDİŞ ÖDEMESİ	944.400,00
TOPLAM	28.333.902,39

Çizelge 28: 2019H03-104827 Nolu Kampüs Altyapısı Projesinin Harcamalarının Detayı



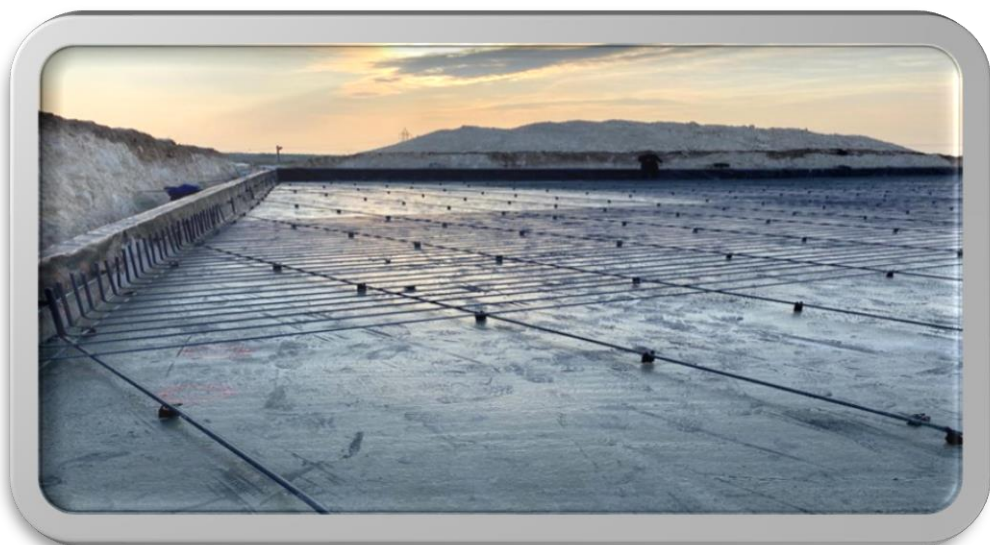

3.4.1. ÇEVRE DÜZENLEME VE SINIR ÇİTİ YAPILMASI İŞİ

Sözleşme bedeli 8.447.000,00 TL olan proje 27.11.2023 tarihinde ihale edilerek 03.01.2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Projeye İlgili Revizyon yapılma ihtiyacı bulunmuş ve sözleşme bedeli 783.218,18 TL artış ile birlikte 08.08.2025 tarihinde ek sözleşme imzalanarak onaylanmıştır. Proje tamamlanarak yerleşke bütünlüğü ve güvenliği açısından önemli bir ihtiyacı karşılanması sağlanmıştır.



İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	ABDULKADİR ÇELİK
Sözleşmenin Konusu	ÇEVRE DÜZENLEME VE SINIR ÇİTİ YAPILMASI İŞİ
Proje Numarası	2019H03-104827
İhale Tarihi	07.03.2025
Sözleşme Tarihi	16.04.2025
Sözleşme Bedeli TL	8.447.000,00
Yer Teslim Tarihi	18.04.2025
Fiilen İşe Başlama Tarihi	18.04.2025
İşin Bitim Tarihi	15.09.2025
Projeye İlgili Revizyonlar	783.218,18
Güncel Sözleşme Bedeli	9.230.218,00 TL
Revizyon Nedenleri	Proje değişikliği
2025 Yılı Harcama Tutarı TL	11.076.261,81
Toplam Harcama Tutarı TL	11.076.261,81
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 29: Çevre Düzenleme ve Sınır Çiti Yapılması İşİ



3.4.2. GİRİŞ KAPISI VE GENEL ÇEVRE DÜZENLEME YAPILMASI YAPIM İŞİ

Sözleşme bedeli 5.013.000,00 TL olan proje 19.09.2024 tarihinde ihale edilerek 07.10.2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Yer teslimi 08.10.2024 tarihinde yapılan proje, 21.12.2024 tarihinde tamamlanmış ve proje için 2024 yılında 5.359.728,23 TL harcama gerçekleşmiştir. Geçici kabul süreci 2025 yılına sarkarak son hak ediş ödemesi olan 731.553,46 TL ile birlikte tamamlanmıştır. Projenin tamamlanması, yerleşke bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunarak güvenlik açısından önemli bir ihtiyacı karşılamıştır.



İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Benser İnşaat Mühendislik Turizm Nakliyat Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Sözleşmenin Konusu	Giriş Kapısı Ve Genel Çevre Düzenleme Yapılması Yapım İşİ
Proje Numarası	2019H03-104827
İhale Tarihi	19.09.2024
Sözleşme Tarihi	07.10.2024
Sözleşme Bedeli TL	5.013.000,00
Yer Teslim Tarihi	08.10.2024
Fiilen İşe Başlama Tarihi	08.10.2024
İşin Bitim Tarihi	30.01.2025
Projeye İlgili Revizyonlar	63.068,11
Güncel Sözleşme Bedeli	5.076.068,11
Revizyon Nedenleri	Yoktur
2025 Yılı Harcama Tutarı TL	731.553,46
Toplam Harcama Tutarı TL	6.091.281,69
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı

Çizelge 30: Giriş Kapısı ve Genel Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ



3.4.3. TARSUS ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM İŞİ

Sözleşme bedeli 21.450.662,00 TL olan proje 27.08.2025 tarihinde ihale edilerek 16.09.2025 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Yer teslimi 18.09.2025 tarihinde yapılan proje için 2025 yılında 13.911.407,12 TL harcama gerçekleşmiştir. Sözleşmeye göre işin tamamlanması 2026 yılına sarktığından projenin kesin hesabı 2026 yılında yapılacaktır. Projenin tamamlanması, yerleşke bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunarak güvenlik açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Güven Yeklitaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Gayrimenkul Danışmanlık ve Ekspertiz Faaliyetleri
Sözleşmenin Konusu	TARSUS ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF İNŞAAT YAPIM İŞİ
Proje Numarası	2019H03-104827
İhale Tarihi	30.07.2025
Sözleşme Tarihi	16.09.2025
Sözleşme Bedeli TL	21.450.662,00
Yer Teslim Tarihi	18.09.2025
Fiilen İşe Başlama Tarihi	18.09.2025
İşin Bitim Tarihi	15.04.2026
Projeyle İlgili Revizyonlar	Bulunmamaktadır.
Güncel Sözleşme Bedeli	5.013.000,00
Revizyon Nedenleri	Yoktur
2025 Yılı Harcama Tutarı TL	13.911.407,12
Toplam Harcama Tutarı TL	13.911.407,12
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	95
İnşaatın Durumu	Devam Ediyor.



3.5. 2019H03-134615 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2025 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 90.000.000,00 TL olup, yıl içinde yapılan ekleme yapılmamış olup 17.000.000,00 TL düşülmüştür. Toplam ödenek 73.000.000,00 TL olup 21.704.979,53 TL harcama yapılmıştır. 2019H03-134615 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine ait detaylar Çizelge-31' te yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Eğitim (5.000 m ²), Kütüphane (4.000 m ²)
Alt Projeler	Kütüphane - Merkezi Derslik
Proje Başlama Yılı	2019
Proje Bitiş Yılı	2027
Proje Tutarı TL	344.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	90.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	17.000.000,00
Toplam Ödenek TL	73.000.000,00
Harcama TL	21.704.979,53
Kalan Ödenek	1.295.020,47
Gerçekleşme Oranı (%)	94,37

Çizelge 31: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
TARSUS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 12 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	6.788.259,79
TARSUS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 13 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	2.308.069,97
TARSUS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 14 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	6.372.237,62
TARSUS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 15 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	4.236.471,88
TARSUS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 16 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ-SON	1.999.940,27
TOPLAM	21.704.979,53

Çizelge 32: 2019H03-134615 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları (Kütüphane Binası)





3.5.1. KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ

Sözleşme bedeli 79.913.000,00 TL olan proje 04.12.2023 tarihinde ihale edilerek 03.01.2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Yapım süreci tamamlanarak 2025 yılında hizmete alınan yatırım, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma altyapısı güçlendirmiş, öğrenci ve akademisyenlerin basılı ve elektronik yayınlara ve diğer kütüphane hizmetlerine erişimini kolaylaştırmıştır.

İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	BENSER- AZ-GÜN İş Ortaklığı
Sözleşmenin Konusu	KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ
Proje Numarası	2019H03-134615
İhale Tarihi	04.12.2023
Sözleşme Tarihi	03.01.2024
Sözleşme Bedeli TL	79.913.000,00
Yer Teslim Tarihi	05.01.2024
Fiilen İşe Başlama Tarihi	05.01.2024
İşin Bitim Tarihi	24.06.2025
Projeye İlgili Revizyonlar	121.825,46
Güncel Sözleşme Bedeli TL	80.034.825,46
Revizyon Nedenleri	Fiyat artışı
2025 Yılı Harcama Tutarı TL	21.704.979,53
Toplam Harcama Tutarı TL	118.471.381,41
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 33: Kütüphane Binası Yapım İşİ



3.6. 2023H05-191421 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2025 yılı bütçesine ayrılan kesintili başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olup, yıl içinde yapılan 3.000.000,00 TL ekleme ile birlikte toplam ödenek 8.000.000,00 TL olup 5.904.546,76 TL harcama yapılmıştır. 2023H05-191421 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine ait detaylar Çizelge-34 ve Çizelge-36'de yer almaktadır.

Sektörü	Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Tarsus Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Tarsus Üniversitesi
Karakteristik	Spor Tesisleri
Alt Projeler	Açık Spor Tesisleri
Proje Başlama Yılı	2023
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	14.469.000
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	5.000.000,00
Eklenecek TL	3.000.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	8.000.000,00
Harcama TL	5.904.546,76
Kalan Ödenek	73,81

Çizelge 34: 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Yapılan İşler	Tutarı (TL)
MERKEZ KAMPÜS HALI SAHA VE SOYUNMA ODASI YAPILMASI YAPIM İŞİNİN 01 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	928.151,51
MERKEZ KAMPÜS HALI SAHA VE SOYUNMA ODASI YAPILMASI YAPIM İŞİNİN 02 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1.577.626,36
MERKEZ KAMPÜS HALI SAHA VE SOYUNMA ODASI YAPILMASI YAPIM İŞİNİN 03 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1.351.735,32
MERKEZ KAMPÜS HALI SAHA VE SOYUNMA ODASI YAPILMASI YAPIM İŞİNİN 04 NOLU SON HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1.573.033,57
MERKEZ VE MYO KAMPÜSÜ HALI SAHA TRİBÜNÜN DECK KAPLAMA YAPILMASI İŞİNİN HAKEDİŞ ÖDEMESİ	474.000,00
TOPLAM	5.904.546,76

Çizelge 35: 2023H05-191421 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin Harcamaları



3.6.1. MERKEZ KAMPÜS HALI SAHA VE SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ



Üniversitemiz kuzey yerleşkesinde 18.08.2025 tarihinde yapımına başlanan Merkez Kampüs Halı Saha ve Soyunma Odası Yapım İşinin sözleşme bedeli 4.498.000,00 TL olup sözleşmeye uygun biçimde yapımı tamamlanan proje 2025 yılı içerisinde hizmete alınmıştır.





İlgili Daire	Tarsus Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	YUSUF DURMAZ
Sözleşmenin Konusu	Merkez Kampüs Halı Saha ve Soyunma Odası Yapım İş
Proje Numarası	2023H05-191421
İhale Tarihi	09.07.2025
Sözleşme Tarihi	18.08.2025
Sözleşme Bedeli TL	4.498.000,00
Yer Teslim Tarihi	19.08.2025
Fiilen İşe Başlama Tarihi	19.08.2025
İşin Bitim Tarihi	06.12.2025
Projeyle İlgili Revizyonlar TL	27.455,63
Güncel Sözleşme Bedeli TL	27.455,63
Revizyon Nedenleri	Proje değişikliği
2025 Yılı Harcama Tutarı TL	5.904.546,76
Toplam Harcama Tutarı TL	5.904.546,76
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)	100
İnşaatın Durumu	Tamamlandı.

Çizelge 36: Merkez Kampüs Halı Saha ve Soyunma Odası Yapım İş



4. STRATEJİK PLAN – YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİSİ

Üniversitemiz 2025– 2029 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerle yatırım programı ilişkisi aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi oluşmuştur.

Stratejik Amaçlar	Hedef	Sektör	Proje Adı	Proje Numarası	Karakteristiği	Harcama Tutarı	Yapılan İşler
A-1 Eğitim – öğretimin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	H-1.4 Eğitim-öğretimin fiziki ve donanım altyapısını geliştirmek	Eğitim- Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2025H03-258645	Etüt-Proje	1.200.000,00	*Tarsus Üniversitesi Tapu Cins Değişikliği İşlemleri Ve Plankote Hazırlanması İçinin Hakediş Ödemesi *Araç Girişi Kapısı Ve Kulübesinin Statik Projesinin Hazırlanması İçinin Hakediş Ödemesi *Tarsus Üniversitesi Merkezi Derslik Binası İçin Zemin Etüdü Ve Geoteknik Rapor Hazırlanması İçinin Hakediş Ödemesi *Tarsus Üniversitesi Merkezi Derslik Binası Mimari, Peyzaj, Statik, Elektrik, Mekanik Uygulama Projeleri Hizmet Alımı İşine Ait Hakediş Ödemesi
A-1 Eğitim – öğretimin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak A-3 Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	H-1.4 Eğitim-öğretimin fiziki ve donanım altyapısını geliştirmek H-3.2 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak	Eğitim- Yükseköğretim	Muhtelif İşler Projesi	2025H03-258646	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	72.353.100,32	*Büro Mefruşatı Alımları *Okul Mefruşatı Alımı *Diğer Mefruşat Alımları *Büro Makinaları Alımı *Laboratuvar Cihazı Alımları *Tıbbi Cihaz Alımları *Bilgisayar Alımları *Diğer Makine ve Teçhizat Alımları *İşyeri Makine Teçhizat Alımları *Laboratuvar Gereçleri Alımları *Kara Taşıtı Alımları *Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları *İçtetim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları *Diğer Fikri Hak Alımları *Diğer Müteahhithlik Giderleri *Malzeme Giderleri *Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri
A-1 Eğitim – öğretimin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak	H-1.4 Eğitim-öğretimin fiziki ve donanım altyapısını geliştirmek	Eğitim- Yükseköğretim	Yayın Alımı	2025H03-258643	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	3.059.496,99	*Basılı Yayın Alımları ve Yapımları *Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
A-3 Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	H-3.2 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak	Eğitim- Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı	2019H03-104827	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	28.333.902,39	* Giriş Kapısı Ve Genel Çevre Düzenleme Yapılması 03 Nolu Son Hakediş * Yangın Hidrant Sistemi Yapılması İçinin Hakediş Ödemesi * Muhtelif İnşaat Yapım İş 01-02-03 Nolu Hakediş Ödemeleri * Kütüphane Çevresi Peyzaj Düzenleme İçinin Ödemesi * Kanalizasyon Hattı Ve Genel Altyapı İşleri İçinin Hakediş Ödemesi * Çevre Düzenleme Ve Sınır Çiti Yapılması İçinin 01-02-03-04 Nolu Hakediş Ödemeleri * Genel Altyapı İşleri Hakediş Ödemesi * Mevcut Harfiyatların Taşınım Serilip Sıkıştırılması İçinin Hakediş Ödemesi
A-3 Kurumsal kapasiteyi ve işleyişi geliştirmek	H-3.2 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak	Eğitim- Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler	2019H03-134615	Eğitim (4.000 m ²)	21.704.979,53	*Kütüphane Binası Yapım İş 12-13-14-15-16 Nolu Hakedişleri Ödemeleri
A-3 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak	H-3.2 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak	Beden Eğitimi ve Spor	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2023H05-191421	Spor Tesisi (5 Adet)	5.904.546,76	* MERKEZ KAMPÜS HALI SAHA VE SOYUNMA ODASI YAPILMASI YAPIM İŞİNİN 01-02-03-04 NOLU HAKEDİŞ ÖDEMELERİ * MERKEZ VE MYO KAMPÜSÜ HALI SAHA TRİBÜNÜN DECK KAPLAMA YAPILMASI İŞİNİN HAKEDİŞ ÖDEMESİ



5. PROJE BAZINDA HARCAMALAR

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2024 Kümülatif Harcama	Toplama Dahil Ödenekler			Toplama Dahil ve Hariç Ödenekler		
							Program	Revize	Harcama	Program	Revize	Harcama
TARSUS ÜNİ.					540.613.000,00	126.430.000,00	230.000.000,00	239.183.000,00	132.556.025,99	230.000.000,00	239.183.000,00	132.556.025,99
EĞİTİM					540.613.000,00	126.430.000,00	230.000.000,00	239.183.000,00	132.556.025,99	230.000.000,00	239.183.000,00	132.556.025,99
Yükseköğretim					526.144.000,00	119.961.000,00	225.000.000,00	231.183.000,00	126.651.479,23	231.183.000,00	225.000.000,00	126.651.479,23
2019H03-104827	Kampüs Altyapısı	Mersin	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2025	73.461.000,00	23.961.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	28.333.902,39	49.500.000,00	49.500.000,00	28.333.902,39
2019H03-104827-104828	Kampüs Altyapısı	Mersin	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2025	73.461.000,00	23.961.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	28.333.902,39	49.500.000,00	49.500.000,00	28.333.902,39
2019H03-134615	Derslik ve Merkezi Birimler	Mersin	Eğitim (5.000 m ²), Kütüphane (4.000 m ²)	2019-2027	344.000.000,00	96.000.000,00	90.000.000,00	73.000.000,00	21.704.979,53	90.000.000,00	73.000.000,00	21.704.979,53
2019H03-134615-212683	Kütüphane	Mersin	Kütüphane (4.000 m ²)	2023-2025	119.000.000,00	96.000.000,00	40.000.000,00	23.000.000,00	21.704.979,53	40.000.000,00	23.000.000,00	21.704.979,53
2019H03-134615-258648	Merkezi Derslik	Mersin	Eğitim (5.000 m ²)	2025-2027	225.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2025H03-258643	Yayın Alımı	Mersin	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2025-2025	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.059.496,99	5.000.000,00	5.000.000,00	3.059.496,99
2025H03-258643-258644	Yayın Alımı	Mersin	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2025-2025	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.059.496,99	5.000.000,00	5.000.000,00	3.059.496,99
2025H03-258645	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Mersin	Etüt-Proje	2025-2025	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00
2025H03-258646	Muhtelif İşler	Mersin	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2025-2025	101.683.000,00	0,00	79.500.000,00	101.683.000,00	72.353.100,32	79.500.000,00	101.683.000,00	72.353.100,32
2025H03-258646-258647	Muhtelif İşler	Mersin	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2025-2025	101.683.000,00	0,00	79.500.000,00	101.683.000,00	72.353.100,32	79.500.000,00	101.683.000,00	72.353.100,32
Beden Eğitimi ve Spor					14.469.000,00	6.469.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	5.904.546,76	8.000.000,00	5.000.000,00	5.904.546,76
2023H05-191421	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Mersin	Spor Tesisi (5 adet)	2023-2025	14.469.000,00	6.469.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	5.904.546,76	5.000.000,00	8.000.000,00	5.904.546,76
2023H05-191421-191422	Açık Spor Tesisleri	Mersin	Spor Tesisi (5 adet)	2023-2025	14.469.000,00	6.469.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	5.904.546,76	5.000.000,00	8.000.000,00	5.904.546,76
Genel Toplam					540.613.000,00	126.430.000,00	230.000.000,00	239.183.000,00	132.556.025,99	230.000.000,00	239.183.000,00	132.556.025,99



6. ÖNERİLER

1. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
3. Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.
4. Proje ve ihale süreçleri, daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.
5. 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi nedeniyle kamuda tasarruf tedbirlerinin yürürlüğe konulması sebebiyle sosyal donatı-spor tesisi gibi Üniversitemiz ihtiyaçlarının sonraki yıllar yatırım programlarına alınabilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmelidir.





TARSUS
ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

